

项目代码：2305-320000-04-01-955021

项目类型：输变电工程

江苏智纬电子科技有限公司 110 千伏接入工程

水土保持设施验收报告

建设单位：国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司

编制单位：江苏嘉溢安全环境科技服务有限公司

2024 年 8 月

江苏智纬电子科技有限公司 110 千伏接入工程

水土保持设施验收报告

建设单位：国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司

编制单位：江苏嘉溢安全环境科技服务有限公司

2024 年 8 月

江苏智纬电子科技有限公司 110 千伏接入工程


水土保持设施验收报告

责任页


(江苏嘉溢安全环境科技服务有限公司)



批准：周 剑（总经理） 

核定：黄佩玉（工程师） 

审查：梅 璇（工程师） 

校核：张训阳（工程师） 

项目负责人：朱 银（工程师） 

编写：朱 银（工程师）（参编章节：第 1~4 章、附件） 

陈 昊（工程师）（参编章节：第 5~7 章、附图） 



编号 320106000202112200042



照
执
业
证

统一社会信用代码
91320106754105204W (1/1)

名称 江苏嘉溢安全环境科技股份有限公司

注册资本 500万元整

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 2003年09月08日

法定代表人 周剑

营业期限 2003年09月08日至*****

围
范
指
经

南京市鼓楼区山西路120号国贸大厦1416室

[illegible]

登记机关



2021年12月20日

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

目 录

1 项目及项目区概况	1
1.1 项目概况	1
1.1.1 地理位置	1
1.1.2 主要技术指标	1
1.1.3 项目投资	2
1.1.4 项目组成及布置	2
1.1.5 施工组织及工期	3
1.1.6 土石方情况	4
1.1.7 征占地情况	4
1.1.8 移民安置和专项设施改（迁）建	4
1.2 项目区概况	4
1.2.1 自然条件	4
1.2.2 水土流失及防治情况	6
2 水土保持方案和设计情况	7
2.1 主体工程设计	7
2.2 水土保持方案	7
2.3 水土保持方案变更	7
2.4 水土保持后续设计	9
3 水土保持方案实施情况	10
3.1 水土流失防治责任范围	10
3.2 弃渣场设置	10
3.3 取土场设置	10
3.4 水土保持措施总体布局	11
3.5 水土保持设施完成情况	11
3.5.1 工程措施	11
3.5.2 植物措施	13
3.5.3 临时措施	14
3.6 水土保持投资完成情况	15

3.6.1 水土保持投资落实情况	15
3.6.2 水土保持投资变化情况	16
4 水土保持工程质量	18
4.1 质量管理体系	18
4.2 各防治分区水土保持工程质量评定	21
4.2.1 项目划分及结果	21
4.2.2 各防治分区工程质量评定	22
4.2.3 弃渣场稳定性评估	23
4.3 总体质量评价	23
5 项目初期运行及水土保持效果	25
5.1 初期运行情况	25
5.2 水土保持效果	25
6 水土保持管理	29
6.1 组织领导	29
6.2 规章制度	29
6.3 建设管理	30
6.4 水土保持监测	30
6.5 水土保持监理	30
6.6 水行政主管部门监督检查意见落实情况	31
6.7 水土保持补偿费缴纳情况	31
6.8 水土保持设施管理维护	31
7 结论	32
7.1 结论	32
7.2 遗留问题安排	32
7.3 下阶段工作安排	33

附件:

- 附件 1、项目建设及水土保持大事记
- 附件 2、核准文件
- 附件 3、水土保持行政许可决定书
- 附件 4、初步设计批复
- 附件 5、分部工程和单位工程验收签证资料
- 附件 6、水土保持补偿费缴纳发票
- 附件 7、水土保持单位工程验收照片
- 附件 8、水土保持验收编制委托函
- 附件 9、项目建设前、后遥感影像图
- 附件 10、验收检查记录表

附图:

- 附图 1、项目地理位置图
- 附图 2-1、间隔改造总平面图
- 附图 2-2、线路路径图
- 附图 3-1、间隔扩建工程水土流失防治责任范围及水土保持措施竣工验收图
- 附图 3-2、线路工程工程水土流失防治责任范围及水土保持措施竣工验收图

前 言

江苏智纬电子科技有限公司电脑精密组件及钠离子电池制造项目位于江苏省高邮市城南经济新区，项目建设用地350亩，建设约40万m²的生产厂房、科研中心及其他附属设施。根据用户提供的《国网高邮市供电公司非居民用电申请表》，智纬申请主变容量为（50+50）MVA，保安电源容量为5000kVA（勤王变站前路开关站供电），建成后最大负荷约70兆瓦，经相关部门认定为二级重要电力用户。为满足该用户的供电需求，提高供电可靠性，建设江苏智纬电子科技有限公司110千伏接入工程是必要的。

本工程分为点型工程和线型工程，共改造间隔1个；新建架空线路路径长2.739km，新建杆塔19基；新建电缆线路路径长0.248km。包括（1）点型工程：勤王220千伏变电站110千伏间隔改造工程，本期将勤王220千伏变电站110千伏备用715间隔调整为智纬电子间隔；新增三相电压互感器。（2）线型工程：①智纬科技~勤王110千伏线路工程（架空）：新建架空线路路径长2.739km；新建塔基共19基，其中新建角钢塔9基，钢管杆10基，均采用灌注桩基础。②智纬科技~勤王110千伏线路工程（电缆）：新建电缆线路路径长0.248km，采用排管、电缆沟敷设。

工程建设总投资902万元（未决算），其中土建投资约210万元。工程总占地面积13447m²，其中永久占地1156m²，临时占地12291m²。土石方挖填总量为9966m³，其中挖方量4983m³（其中表土剥离815m³），填方量4983m³（其中表土回覆815m³），无余方，无借方。工程开工时间为2023年11月，完工时间为2024年3月，总工期5个月。

2023年6月15日，江苏省发展和改革委员会以《省发展改革委关于苏州沈塘220千伏输变电工程等电网项目核准的批复》（苏发改能源发〔2023〕646号）通过了本工程核准。2023年7月27日，国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司以《国网扬州供电公司关于江苏智纬电子科技有限公司110千伏接入工程初步设计的批复》（扬供电建〔2023〕183号）通过了本工程初设。2023年9月25日，江苏省水利厅以《省水利厅关于准予江苏智纬电子科技有限公司110千伏接入工程水土保持方案告知承诺制的行政许可决定》（苏水许可〔2023〕180号）对本工程水土保持方案进行批复。

本项目建设单位为国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司，由其负责水土保持方案的具体落实。

通过招投标，建设单位委托江苏兴力工程管理有限公司新兴分公司承担本工程监理工作，并代监水保。监理单位接受委托后，及时组建项目监理部，组织水土保持监理交底会，在单位工程开工前，对施工单位报送的单位工程施工组织设计中有关水土保持的内容进行审核，从水土保持的角度提出优化施工方案与方法的建议并答复意见。建设过程中，在监理协调作用下，建设单位、施工单位、监理单位三方建立了公平、公正、和谐的建设环境，促进了有限资源的共享。在参建单位的共同努力下，按时、保质、保量的完成了本项目水土保持相关的建设任务。

2024年5月，建设单位国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司委托江苏嘉溢安全环境科技服务有限公司开展水土保持设施验收工作。2024年7月，扬州供电分公司组织主体工程设计、施工单位以及监理单位对本项目进行了水土保持工程项目划分，组织监理和其他参加单位陆续开展了本项目的水土保持分部工程、单位工程的验收工作。本项目水土保持工程包含2个单位工程，2个分部工程和8个单元工程，单元工程全部合格。

2024年7月，我单位在查阅建设单位提供的自验资料、走访各参建单位以及现场核查的基础上，编制完成《江苏智纬电子科技有限公司110千伏接入工程水土保持设施验收报告》。

综上，在项目建设过程中，各参建单位认真贯彻落实建设单位部署，基本落实了本项目水土保持方案及批复文件的要求，水土保持工程建设符合国家水土保持法律法规及技术规范的有关规定和要求，各项水土保持措施质量均合格并能持续、安全、有效运转，六项防治目标值达到了方案设计的防治目标。

在水土保持设施验收工作开展过程中，得到了各施工单位、设计单位、监理单位的大力支持和帮助，在此一并致谢！

水验收条件相符性分析表

序号	《生产建设项目水土保持方案 管理办法》(水利部令第 53 号) 相关规定不得通过验收的情形	工程实际情况	符合性分析
1	未依法依规履行水土保持方案 编报审批程序或者开展水土保 持监测、监理的	本工程依法依规编制了水土保持方 案，经分析不涉及重大变更。报告 表项目未开展水土保持监测。本工 程的水土保持监理纳入主体工程 中，由主体工程监理单位进行了监 理；	符合验收条件
2	弃土弃渣未堆放在经批准的水 土保持方案确定的专门存放地 的	本工程无余（弃）方；	符合验收条件
3	水土保持措施体系、等级和标 准或者水土流失防治指标未按 照水土保持方案批复要求落实 的	本工程已按照水保方案批复的措施 体系、等级和标准落实了水土保持 措施；	符合验收条件
4	存在水土流失风险隐患的	经现场调查，本工程不存在水土流 失风险隐患。	符合验收条件
5	水土保持设施验收材料明显不 实、内容存在重大缺项、遗漏 的	本工程水土保持设施验收材料均按 实际情况进行编制。	符合验收条件
6	存在法律法规和技术标准规定 不得通过水土保持设施验收的 其他情形的	本工程水土保持验收符合水土保持 相关法律法规要求。	符合验收条件
序号	苏水规〔2021〕8号规定不得 通过验收的情形	工程实际情况	符合性分析
1	水土保持分部工程和单位工程 未经验收或验收不合格的	本工程水土保持分部工程和单位工 程经验收合格；	符合验收条件
2	未依法依规缴纳水土保持补偿 费的	建设单位已按水保批复足额缴纳了 水土保持补偿费；	符合验收条件
3	存在其他不符合相关法律法规 规定情形的	工程水保验收符合水保相关法律法 规要求。	符合验收条件

表 1.1-1 水土保持设施验收特性表

验收工程名称	江苏智纬电子科技有限公司 110 千伏接入工程		验收工程地点	扬州市高邮市
验收工程性质	新建输变电工程		验收工程规模	13447m²
所在流域	长江流域		所属国家级、省级水土流失防治区	江苏省省级水土流失重点预防区
水土保持方案批复部门、时间及文号	江苏省水利厅 2023 年 9 月 25 日，苏水许可〔2023〕180 号			
工期	主体工程		2023 年 11 月~2024 年 3 月	
	水保工程		2023 年 11 月~2024 年 3 月	
水土流失防治责任范围面积	水土保持方案		13853m²	
	实际扰动范围		13447m²	
方案批复的水土流失防治目标			实际达到的水土流失防治目标	
水土流失治理度	98%		水土流失治理度	99.43%
土壤流失控制比	1.0		土壤流失控制比	3.4
渣土防护率	98%		渣土防护率	99.94%
表土保护率	92%		表土保护率	98.60%
林草植被恢复率	98%		林草植被恢复率	99.29%
林草覆盖率	27%		林草覆盖率	95.60%
主要工程量	工程措施	表土剥离 815m³，土地整治 13015m²		
	植物措施	撒播草籽 10682m²		
	临时措施	泥浆沉淀池 19 座，密目网苫盖 7100m²，铺设钢板 1850m²		
工程质量评定	评定项目	总体质量评定		外观质量评定
	工程措施	合格		合格
	植物措施	合格		合格
水土保持投资	水土保持方案投资		52.60 万元	
	实际投资		42.51 万元	
	投资变化原因		基本按照方案要求落实了批复的水土保持投资，工程措施土地整治面积较方案设计均有所减少 406m²，工程投资减少；植物措施面积较方案设计减少 406m²，植物措施投资有所减少；密目网苫盖减少 580m²，临时排水沟和临时沉沙池均未实施，彩条布铺垫替换成经济适用的密目网苫盖，临时投资有所减少，因此，水土保持总投资减少。	
工程总体评价	水土保持工程建设符合国家水土保持法律法规、规程规范合技术标准的相关规定和要求，各项工程安全可靠，工程总体质量达到了设计标准，质量合格，工程建设完成后水土流失防治效果达到水保方案批复的目标值，水土保持设施管理维护责任明确，符合验收条件。			
水土保持方案编制单位	江苏辐环环境科技服务有限公司		施工单位	扬州广源集团有限公司
水土保持监测单位	/		水土保持监	江苏兴力工程管理有限公司

		理单位	司新兴分公司
水土保持设施验收 报告编制单位	江苏嘉溢安全环境科技 服务有限公司	建设单位	国网江苏省电力有限公司扬 州供电分公司
地址	南京市鼓楼区山西路 120 成套大厦 14 楼	地址	扬州市维扬路 179 号
联系人	朱银	联系人	黄一芄
电话	025-83750629	电话	18952557381
电子邮箱	1780667300@qq.com	电子邮箱	/

1 项目及项目区概况

1.1 项目概况

1.1.1 地理位置

本工程位于扬州市高邮市高邮城南经济新区（车逻镇）。①间隔改造区域中心经纬度坐标（N32° 43′ 46.11″，E119° 29′ 38.82″）；②智纬科技~勤王110千伏线路工程（架空）：新建线路起点为220kV勤王变110kV出线间隔（N32° 43′ 46.10″，E119° 29′ 38.84″），终点为绿扬路与兴区路交叉口东北角T19（N32° 44′ 54.27″，E119° 29′ 42.96″）；③智纬科技~勤王110千伏线路工程（电缆）：新建线路起点为T1塔（N32° 43′ 46.04″，E119° 29′ 37.33″），终点为T2塔（N32° 43′ 51.61″，E119° 29′ 37.74″）。

1.1.2 主要技术指标

工程名称：江苏智纬电子科技有限公司110千伏接入工程

项目建设性质：新建输变电工程

建设单位：国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司

建设规模：

本工程分为点型工程和线型工程，共改造间隔1个；新建架空线路路径长2.739km，新建杆塔19基；新建电缆线路路径长0.248km。

（1）点型工程

勤王220千伏变电站110千伏间隔改造工程：本期将勤王220千伏变电站110千伏备用715间隔调整为智纬电子间隔；新增三相电压互感器。

（2）线型工程

①智纬科技~勤王110千伏线路工程（架空）：新建架空线路路径长2.739km；新建塔基共19基，其中新建角钢塔9基，钢管杆10基，均采用灌注桩基础。

②智纬科技~勤王110千伏线路工程（电缆）：新建电缆线路路径长0.248km，采用排管、电缆沟敷设。

工程于2023年11月开工，2024年3月完工，总建设工期5个月。

本工程挖填方总量共计9966m³，其中挖方总量4983m³（表土剥离815m³），填方总量4983m³（表土回覆815m³），无余方，无借方。

项目基本情况及经济技术指标表见 1.1-1。

表 1.1-1 项目基本情况及经济技术指标表

一、项目基本情况		
项目名称	江苏智纬电子科技有限公司110 千伏接入工程	
建设地点	扬州市高邮市高邮城南经济新区（车逻镇）	
建设性质	新建输变电工程	
建设单位	国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司	
电压等级	110kV	
工程规模	本工程分为点型工程和线型工程，共改造间隔1个；新建架空线路路径长2.739km，新建杆塔19基；新建电缆线路路径长0.248km。	
工程总投资	902万元，其中土建投资约210万元	
建设工期	2023年11月~2024年3月	
二、项目经济技术指标表		
架空线路		
(1)	线路长度	新建架空总长度2.739km
(2)	塔基数量	新建19基，其中角钢塔9基，钢管杆10基
(3)	导线规格	JL/G1A-400/35
(4)	地线规格	OPGW-120
电缆线路		
(1)	线路长度	新建电缆总长度0.248km
(2)	电缆截面	800mm ²
(3)	电缆型式	排管、电缆沟
间隔改造		
(1)	电压等级	110kV
(2)	新增电压互感器个数	3个
(3)	设备布置	落地余缆箱2台，端子箱1台

1.1.3 项目投资

工程建设总投资902万元（未决算），其中土建投资约210万元。

1.1.4 项目组成及布置

（1）项目组成

本工程建设内容包括①勤王220千伏变电站110千伏间隔改造工程；②智纬科技~勤王110千伏线路工程。

（2）平面布置

①勤王220千伏变电站110千伏间隔改造工程

本期启用1回110千伏出线间隔，原为自北向南的第7个备用间隔，新增3台110kV户外电容式电压互感器，落地余缆箱2台，端子箱1台，改造后出线7回，

尚留7回110kV出线间隔位置。扩建后接线形式不变。

②智纬科技~勤王110千伏线路工程

线路自220kV勤王变110kV出线备用7I5间隔向西架空出线至T1，架空改电缆引下，新建电缆线路向东穿越现状水泥路后左转向北，沿现状水泥路东侧新建电缆线路穿越110kV勤子线和110kV勤武线至T2，电缆改架空，继续向北走线至T3，左转向西走线至G233国道东侧T4，线路右转向北，沿G233国道东侧（杆塔边缘距道路控制线20m外）架空走线跨越S333省道，中心大道至浩芝村团结组庄台河北侧与乔科公司南侧院墙之间右转向东至绿扬路东侧T17后，由绿扬路东侧向北至绿扬路与兴区路交叉口东北角T19结束。

1.1.5 施工组织及工期

（1）施工交通

通过现场踏勘，本工程施工临时道路长度共 280m，道路平均宽度 4.0m。因此，施工临时道路占地面积为 1120m²，均为临时占地。

（2）施工生产生活区

根据沿线的交通情况，租用已有库房或场地作为材料站，具体地点由施工单位根据施工中具体情况选定，便于塔材、钢材、线材、水泥、金具和绝缘子的集散。由于线路施工周期不长，因此工程临时施工生活用房采用租用民房的方式解决。施工生产区布设在塔基施工区域的临时占地中。

（3）施工材料

工程建设所有施工原材料均来自于外购，不涉及料场。

（4）施工水、电

施工给水：施工用水主要为砂浆拌浆、混凝土搅拌等，单个塔基用水量极小，因此可采用附近河流抽水和接取市政自来水取水相结合方案。

施工排水：间隔改造工程施工过程中雨水排入原变电站自有排水系统，线路工程施工过程中的雨水通过排水沟收集、经沉沙池沉淀后排入临近道路的市政雨污水管网或附近的沟渠中。本工程外排雨水均通过沉沙池沉淀处理，且外排水量较小，不会对附近的沟渠造成影响。

施工用电：施工过程中用电根据周边设施情况安排，周围已有用电用户区，可按照安全用电规定引接用于施工用电，无用电用户区可采用自备小型柴油发电

机提供施工电源。

(5) 工期

本项目 2023 年 11 月动工，2024 年 3 月完工，总工期 5 个月。

1.1.6 土石方情况

本工程挖填方总量共计 9966m³，其中挖方总量 4983m³（表土剥离 815m³），填方总量 4983m³（表土回覆 815m³），无余方，无借方。

1.1.7 征占地情况

本项目总占地面积 13447m²，其中永久占地 1156m²，临时占地 12291m²。

表 1.1-2 工程征占地统计表 （单位：m²）

项目组成	占地面积			占地类型				水土流失防治责任范围
	永久占地	临时占地	小计	公共管理与公共服务用地	耕地	交通运输用地	其他土地	
间隔扩建区	110	0	110	110	0	0	0	110
塔基区	886	5321	6207	0	1026	3847	1334	6207
牵张场基跨越场区	0	3400	3400	0	0	2800	600	3400
施工道路区	0	1120	1120	0	230	640	250	1120
电缆施工区	160	2450	2610	0	1117	82	1411	2610
合计	1156	12291	13447	110	2373	7369	3595	13447

1.1.8 移民安置和专项设施改（迁）建

本项目不涉及移民安置和专项设施改（迁）建。

1.2 项目区概况

1.2.1 自然条件

(1) 地形、地貌

线路所在区地貌属里下河水网平原。线路沿线场地现状主要为绿化带、农田和空闲地，地势较为平坦，沿线地面高程一般为 2.0m~2.7m（1985 国家高程基准）。水系发育，交通条件良好。

(2) 气象

项目所在地高邮市属亚热带湿润气候区，具有四季分明、气候湿润、光照充足、雨量充沛、无霜期长的特点。根据高邮气象站 1957-2022 年实测资料统计，项目区多年气象要素情况如下：

表 1.2-1 工程项目区域气象特征值一览表

气象要素		单位	数值
气温	年平均气温	°C	15
	极端最高温度(2003.8.2)	°C	39.8
	极端最低温度(1984.1.23)	°C	-10.7
风速	年平均风速	m/s	2.6
气压	年平均大气压	kpa	101.6
降雨量	多年平均降雨量	mm	1018
	年最大降雨量(1991)	mm	1823.9
	日最大降雨量(2007.7.9)	mm	164.7
积雪、冻土深度	最大积雪深度	cm	24
	冻土深度	mm	200
风向和频率	年主导风向和频率	/	E/10.0%
	冬季主导风向和频率	/	NE/10.0%
	夏季主导风向和频率	/	E/12.0%

(3) 水文

高邮地处江苏省中部，南临长江，北濒高邮湖，东濒邵伯湖，京杭大运河及淮河入江水道贯穿南北，境内河道分属淮河、长江两大流域。境内主要灌排、交通河流有 19 条，即京杭大运河高邮段、澄潼河、龙须沟、人字河、张叶沟、小泾沟、三阳河、第三沟、南澄子河、南关大沟、北澄子河、东平河、横泾河、六安河、新六安河、二里大沟、子婴河、天菱河、向阳河。本工程处于淮河流域中下游地区，位于高邮湖以南地区，京杭大运河、淮河入江水道、邵伯湖以东地区。

项目周边河流主要为南澄子河、南关大沟、备战河、丁庄河、老勤王河。本工程新建架空线路跨越南关大沟和备战河。

(4) 地质、地震

根据本工程有关勘测资料和现场调查成果，沿线整体地层分布如下：第四系全新统冲淤积成因的淤泥质粉质粘土与交替出现的粉土夹粉质粘土→淤泥质粉质粘土(或粉质粘土夹粉土)→粉土夹粉质粘土。根据《中国地震动参数区划图》，本工程沿线地震烈度为Ⅶ度，设计基本地震加速度为 0.05g，地震动加速度反应谱特征周期为 0.90s。

（5）土壤、植被

高邮市土壤分为 3 个土类、8 个亚类、16 个土层、38 个土种。土壤类型以水稻土、潮土及沼泽土为主。本工程沿线土壤类型为水稻土，可剥离表土厚度约 30cm。

项目区地带性植被类型为亚热带常绿落叶阔叶混交林类型，植被资源丰富，树木种类繁多。主要有柳、榆、杨、意杨、刺槐等树种，区内低洼湿地区域分布有柴蒲、莲藕、菱角及芦苇等水生植物。项目区周边主要种植水稻、小麦、油菜、花生等农作物，周边区域林草植被覆盖率约为 20%。

1.2.2 水土流失及防治情况

项目位于扬州市高邮市高邮城南经济新区（车逻镇），根据《江苏省水土保持规划（2015-2030）》，属于南方红壤区——江淮丘陵及下游平原区——江淮下游平原农田防护水质维护区——盐淮扬平原农田防护水质维护区，水土流失类型以水力侵蚀为主，侵蚀强度为微度；根据江苏省水利厅关于发布《江苏省省级水土流失重点预防区和重点预防区》的公告（苏水农〔2014〕48 号），项目所在区域属于江苏省省级水土流失重点预防区。根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018），本项目水土流失防治标准应执行南方红壤区防治一级标准。

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），本项目容许土壤侵蚀模数为 $500t/(km^2 \cdot a)$ 。根据现场勘查项目沿线经过地形主要为平原，项目用地多为农田，结合江苏省水土流失分布图，根据项目所在地江苏省水土保持公报，参照项目区同类项目监测数据，最终确定了项目区土壤侵蚀模数背景值为 $150t/(km^2 \cdot a)$ 。

2 水土保持方案和设计情况

2.1 主体工程设计

2022 年 11 月 4 日，高邮市自然资源和规划局以《关于请求确认江苏高邮智纬 110 千伏变电站 110 千伏业扩配套工程线路路径的复函》（邮自然资〔2022〕145 号）同意了本工程线路路径；

2023 年 4 月 28 日，国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司以《国网扬州供电公司关于江苏智纬电子科技有限公司 110 千伏接入工程（电气工程部分）可行性研究的意见》（扬供电发展〔2023〕104 号）通过了本工程可研；

2023 年 6 月 15 日，江苏省发展和改革委员会以《省发展改革委关于苏州沈塘 220 千伏输变电工程等电网项目核准的批复》（苏发改能源发〔2023〕646 号）通过了本工程核准；

2023 年 7 月 27 日，国网扬州供电公司以《国网扬州供电公司关于江苏智纬电子科技有限公司 110 千伏接入工程初步设计的批复》（扬供电建〔2023〕183 号）通过了本工程初设。

2.2 水土保持方案

根据工程进度规划和水土保持相关法律法规要求，本工程的水土保持设计由江苏辐环环境科技有限公司于 2023 年 8 月编制完成《江苏智纬电子科技有限公司 110 千伏接入工程水土保持方案报告表》。2023 年 9 月根据专家意见修改形成《江苏智纬电子科技有限公司 110 千伏接入工程水土保持方案报告表》并上报江苏省水利厅。

2023 年 9 月 25 日，江苏省水利厅以《省水利厅关于准予江苏智纬电子科技有限公司 110 千伏接入工程水土保持方案告知承诺制的行政许可决定》（苏水许可〔2023〕180 号）对本工程水土保持方案进行批复。

2.3 水土保持方案变更

依据《生产建设项目水土保持方案管理办法》（2023 年 1 月 17 日水利部令第 53 号发布），第三章第十六条和第十七条以及江苏省水利厅关于印发《江苏省生产建设项目水土保持管理办法》的通知（苏水规〔2021〕8 号）第十七条对本项目变更情况进行了筛查，从筛查结果看，本项目不涉及重大变更，评价结果

详见表 2-1。

表 2-1 项目水土保持方案变更管理规定符合性分析与评价表

序号	《生产建设项目水土保持方案管理办法》(2023 年 1 月 17 日水利部令第 53 号发布)相关规定	方案设计情况	本项目实际实施情况	变化是否达到变更报批条件
1	第十六条: 水土保持方案经批准后存在下列情形之一的, 生产建设单位应当补充或者修改水土保持方案, 报原审批部门审批	/	/	/
1.1	工程扰动新涉及水土流失重点预防区或者重点治理区	本工程所在区域属于江苏省省级水土流失重点预防区	本工程所在区域属于江苏省省级水土流失重点预防区	较方案设计未发生变化, 不涉及变更
1.2	水土流失防治责任范围或者开挖填筑土石方总量增加 30%以上;	方案设计水土流失防治责任范围为 13853m ² ; 方案设计的开挖填筑土石方总量为 9966m ³	实际水土流失防治责任范围面积 13447m ² ; 实际开挖填筑土石方挖填总量 9966m ³	实际面积减少 406m ² , 较方案设计减少了 2.93%; 实际开挖填筑土石方总量较方案设计未发生变化, 均未超过 30%, 未达到重大变更
1.3	线型工程山区、丘陵区部分线路横向位移超过 300m 的长度累计达到该部分线路长度的 30% 以上的;	不涉及山区、丘陵区	不涉及山区、丘陵区	不涉及变更
1.4	表土剥离或者植物措施总面积减少 30%以上的;	方案设计的表土剥离量 815m ³ ; 方案设计植物措施面积 11088m ²	实际表土剥离量 815m ³ ; 本工程实际实施植物措施面积 10606m ²	较方案设计未发生变化; 方案设计的植物措施面积减少 482m ² , 减少 4.35%, 均未达到重大变更
1.5	水土保持重要单位工程措施发生变化, 可能导致水土保持功能显著降低或者丧失。	方案设计工程措施、植物措施和临时措施相结合	经验收组现场核查, 水土保持重要单位工程措施体系较为完善, 不存在可能导致水土保持功能显著降低或丧失的变化	不涉及变更
2	第十七条: 在水土保持方案确定的弃渣场以外	本工程不单独另设弃渣场	本工程不单独另设弃渣场	不涉及变更

	新设弃渣场的，或者因弃渣场增加导致弃渣场等级提高的，生产建设单位应当开展弃渣减量化，资源化论证，并在弃渣前编制水土保持方案补充报告，报原审批部门审批			
序号	江苏省水利厅关于印发《江苏省生产建设项目水土保持管理办法》的通知（苏水规〔2021〕8号）*	/	/	/
1	第十七条（四）施工道路或者伴行道路等长度增加 20%以上的	方案设计阶段施工道路长度 280m	实际施工道路长度布设 280m	实际施工道路长度较方案设计未发生变化，不涉及重大变更
2	第十七条（五）桥梁改路堤或者隧道改路堑累计长度 20 公里以上的	本工程不涉及	本工程不涉及	不涉及变更
注*：苏水规〔2021〕8号只补充了与《生产建设项目水土保持方案管理办法》（2023 年 1 月 17 日水利部令第 53 号发布）有差异的内容。				

2.4 水土保持后续设计

建设单位委托扬州浩辰电力设计有限公司开展施工图阶段的设计，水土保持设施也包含在主体工程中同时设计。在施工图阶段，对初步设计内容进行了进一步细化和优化，并对施工组织及土建工程工艺流程提出了水土保持要求。

在方案编制阶段，方案编制单位通过查阅初步设计、施工图及监理资料，进一步构架完善了工程水土保持措施体系。

为了切实在管理中落实好水土保持方案，建设单位在本工程建设中，把水土保持工程建设管理纳入到整个工程建设管理体系中。

具体水土保持措施设计包括场地整治工程、点片状植被工程两个分部工程；土地整治工程和植被建设工程两个单位工程。

在施工过程中全面实行了项目法人责任制、招标投标制和工程监理制。在施工过程中，注意监督承建单位加强分包管理。水土保持设施均已落实了管护责任、管护人员和管护制度。水土保持工程设施由工程部统一负责管理和维护，并制定了《服务质量考核标准》。

3 水土保持方案实施情况

3.1 水土流失防治责任范围

根据江苏省水利厅批复的《江苏智纬电子科技有限公司 110 千伏接入工程水土保持方案报告表》，本项目水土流失防治责任范围为 13853m²。

根据现场实地测量，结合查阅的工程施工图、征占地等资料，江苏智纬电子科技有限公司 110 千伏接入工程实际扰动地表面积为 13447m²，相比水土保持方案确定的防治责任范围减少 406m²，具体变化情况见表 3.1-1。

表 3.1-1 水土流失防治责任范围实际发生与方案批复对比表 （单位：m²）

防治分区	方案设计①			实际发生②			变化值②-①		
	永久占地	临时占地	防治责任范围	永久占地	临时占地	防治责任范围	永久占地	临时占地	防治责任范围
间隔改造区	110	0	110	110	0	110	0	0	0
塔基区	886	5727	6613	886	5321	6207	0	-406	-406
牵张场及跨越场区	0	3400	3400	0	3400	3400	0	0	0
施工道路区	0	1120	1120	0	1120	1120	0	0	0
电缆施工区	160	2450	2610	160	2450	2610	0	0	0
合计	1156	12697	13853	1156	12291	13447	0	-406	-406

建设期水土流失防治责任范围 13447m²，较水土保持方案设计的 13853m² 减少了 406m²，变化原因如下：

（1）塔基区：实际施工阶段，严格控制施工范围，用于堆放施工材料及土方区域面积减少，因此该区占地面积较方案设计减少了 406m²。

3.2 弃渣场设置

水土保持方案中未单独设置弃渣场，实际建设中，本项目无弃渣场，与水土保持方案一致。

3.3 取土场设置

水土保持方案中未单独设置取土场，实际建设中，本项目无取土场，与水土保持方案一致。

3.4 水土保持措施总体布局

建设单位按照水土保持有关法规的要求,根据项目主体工程开发建设的特点,以水土流失预测为科学依据,合理配置各防治区的水土保持措施。根据各区具体情况分别采取了适当的工程措施、植物措施和临时措施。利用植物措施,增加植被覆盖度,减缓地表径流,做到项目开发与防治相结合,点线面相结合,水土流失防护体系较完善。

实际施工中,施工单位严格按照水土保持方案设计要求,实施各项水土保持措施,措施种类根据主体工程设计进行了调整,来达到相应的防治要求。

表 3.4-1 水土保持措施总体布局实际发生与方案批复对比表

防治分区	措施类型	方案批复	实际实施	变化情况
间隔改造区	工程措施	/	/	/
	植物措施	/	/	/
	临时措施	密目网苫盖	/	实际密目网苫盖未实施
塔基区	工程措施	表土剥离、土地整治	表土剥离、土地整治	与方案基本一致
	植物措施	撒播草籽	撒播草籽	与方案基本一致
	临时措施	泥浆沉淀池、密目网苫盖、土质排水沟、土质沉沙池	泥浆沉淀池、密目网苫盖	土质排水沟和土质沉沙池实际未布设
牵张场及跨越场区	工程措施	土地整治	土地整治	与方案基本一致
	植物措施	撒播草籽	撒播草籽	与方案基本一致
	临时措施	铺设钢板、彩条布铺垫	铺设钢板、彩条布铺垫	与方案基本一致
施工道路区	工程措施	土地整治	土地整治	与方案基本一致
	植物措施	撒播草籽	撒播草籽	与方案基本一致
	临时措施	铺设钢板	铺设钢板	与方案基本一致
电缆施工区	工程措施	表土剥离、土地整治	表土剥离、土地整治	与方案基本一致
	植物措施	撒播草籽	撒播草籽	与方案基本一致
	临时措施	密目网苫盖、土质排水沟、土质沉沙池	密目网苫盖	土质排水沟和土质沉沙池实际未布设

3.5 水土保持设施完成情况

3.5.1 工程措施

(1) 方案设计水土保持工程措施

根据已批复的《江苏智纬电子科技有限公司 110 千伏接入工程水土保持方案

报告表》，本项目工程措施见表 3.5-1。

表 3.5-1 水土保持工程措施方案批复情况

防治分区	措施名称	单位	方案设计
塔基区	表土剥离	m ³	705
	土地整治	m ²	6533
牵张场及跨越场区	土地整治	m ²	3400
施工道路区	土地整治	m ²	1120
电缆施工区	表土剥离	m ³	110
	土地整治	m ²	2368

(2) 实际实施水土保持工程措施

根据施工组织设计资料及遥感影像资料分析，本工程水土保持工程措施实施情况见表 3.5-2。

表 3.5-2 水土保持工程措施实施情况

防治分区	措施名称	单位	实际实施
塔基区	表土剥离	m ³	705
	土地整治	m ²	6127
牵张场及跨越场区	土地整治	m ²	3400
施工道路区	土地整治	m ²	1120
电缆施工区	表土剥离	m ³	110
	土地整治	m ²	2368

(3) 工程措施方案设计与实际实施对比情况

经过（1）和（2）对比可知，工程措施工程量根据主体设计要求进行了部分调整，具体见表 3.5-3 所示。

表 3.5-3 水土保持工程措施方案设计与实际实施对比情况

防治分区	措施名称	单位	方案设计	实际完成	变化情况	实施位置	实施时段
塔基区	表土剥离	m ³	705	705	0	植被良好的区域	2023.11
	土地整治	m ²	6533	6127	-406	除硬化外裸露地表	2024.2
牵张场及跨越场区	土地整治	m ²	3400	3400	0	全区	2024.2
施工道路区	土地整治	m ²	1120	1120	0	全区	2024.2
电缆施工区	表土剥离	m ³	110	110	0	植被良好的区域	2023.10
	土地整治	m ²	2368	2368	0	除硬化外裸露地表	2024.2

如表 3.5-3 所示，水土保持工程措施实际完成工程量与水土保持方案批复的

工程量比较，变化的主要原因有：

①塔基区：实际施工阶段，由于施工扰动范围减少，因此土地整治面积较方案设计减少 406m²。

3.5.2 植物措施

（1）方案设计水土保持植物措施

根据已批复的《江苏智纬电子科技有限公司 110 千伏接入工程水土保持方案报告表》，本工程植物措施见表 3.5-4。

表 3.5-4 水土保持植物措施方案批复情况

防治分区	措施名称	单位	方案设计
塔基区	撒播草籽	m ²	5527
牵张场及跨越场区	撒播草籽	m ²	3400
施工道路区	撒播草籽	m ²	890
电缆施工区	撒播草籽	m ²	1271

（2）实际实施水土保持植物措施

根据施工组织设计资料及现场遥感影像分析，本工程水土保持植物措施实施情况见表 3.5-5。

表 3.5-5 水土保持植物措施实施情况

防治分区	措施名称	单位	实际实施
塔基区	撒播草籽	m ²	5121
牵张场及跨越场区	撒播草籽	m ²	3400
施工道路区	撒播草籽	m ²	890
电缆施工区	撒播草籽	m ²	1271

（3）工程措施方案设计与实际实施对比情况

经过（1）和（2）对比可知，植物措施工程量根据主体设计要求进行了部分调整，具体见表 3.5-6 所示。

表 3.5-6 水土保持植物措施方案设计与实际实施对比情况

防治分区	措施名称	单位	方案设计	实际完成	变化情况	实施位置	实施时段
塔基区	撒播草籽	m ²	5527	5121	-406	占用绿化带、空闲地除硬化外区域	2024.3
牵张场及跨越场区	撒播草籽	m ²	3400	3400	0	占用绿化带、空闲地区域	2024.3
施工道路区	撒播草籽	m ²	890	890	0	占用绿化带、空闲地区域	2024.3
电缆施工区	撒播草籽	m ²	1271	1271	0	占用绿化带、空闲地区域	2024.3

如表 3.5-6 所示，水土保持植物措施实际完成工程量与水土保持方案批复的

工程量比较，变化的主要原因有：

①塔基区：实际施工阶段，该区占地面积减少，占用绿化带和空闲地区域面积减少，可恢复植被面积减少，因此撒播草籽面积较方案设计减少 406m²。

3.5.3 临时措施

（1）方案设计水土保持临时措施

根据已批复的《江苏智纬电子科技有限公司 110 千伏接入工程水土保持方案报告表》，本工程临时措施见表 3.5-7。

表 3.5-7 水土保持临时措施方案批复情况

防治分区	措施名称	单位	方案设计
间隔改造区	密目网苫盖	m ²	80
塔基区	泥浆沉淀池	座	19
	密目网苫盖	m ²	4000
	土质排水沟	m	1220
	土质沉沙池	座	19
牵张场及跨越场区	铺设钢板	m ²	1000
	彩条布铺垫	m ²	2000
施工道路区	铺设钢板	m ²	850
电缆施工区	密目网苫盖	m ²	1600
	土质排水沟	m	240
	土质沉沙池	座	2

（2）实际实施水土保持临时措施

根据施工组织设计资料及现场遥感影像分析，本工程水土保持临时措施实施情况见表 3.5-8。

表 3.5-8 水土保持临时措施实施情况

防治分区	措施类型	单位	实际实施
间隔改造区	密目网苫盖	m ²	0
塔基区	泥浆沉淀池	座	19
	密目网苫盖	m ²	3500
牵张场及跨越场区	铺设钢板	m ²	1000
	彩条布铺垫	m ²	0
	密目网苫盖	m ²	2000
施工道路区	铺设钢板	m ²	850
电缆施工区	密目网苫盖	m ²	1600

（3）工程措施方案设计与实际实施对比情况

经过（1）和（2）对比可知，临时措施工程量根据主体设计要求进行了部分

调整，具体见表 3.5-9 所示。

表 3.5-9 水土保持临时措施方案设计与实际实施对比情况

防治分区	措施名称	单位	方案设计①	实际完成②	变化情况②-①	实施位置	实施时段
间隔改造区	密目网苫盖	m ²	80	0	-80	裸露地表	2024.3
塔基区	泥浆沉淀池	座	19	19	0	灌注桩基础旁	2024.11
	密目网苫盖	m ²	4000	3500	-500	裸露地表及临时堆土区域	2024.11-2024.12
	土质排水沟	m	1220	0	-1220	/	/
	土质沉沙池	座	19	0	-19	/	/
牵张场及跨越场区	铺设钢板	m ²	1000	1000	0	松软路面区域	2023.12-2024.1
	彩条布铺垫	m ²	2000	0	-2000	/	/
	密目网苫盖	m ²	0	2000	+2000	裸露地表	2023.12-2024.1
施工道路区	铺设钢板	m ²	850	850	0	机器占压区域	2023.11-2023.12
电缆施工区	密目网苫盖	m ²	1600	1600	0	裸露地表	2024.1
	土质排水沟	m	240	0	-240	/	/
	土质沉沙池	座	2	0	-2	/	/

如表 3.5-9 所示，水土保持临时措施实际完成工程量与水土保持方案批复的工程量比较，变化的主要原因有：

①间隔改造区：已建变电站中，间隔扩建工程施工避免苫盖覆盖，容易引起变电站火灾等危险事项发生，因此，间隔扩建区未实施密目网苫盖措施。

②塔基区：实际施工阶段，仅对裸露地表和临时堆土区域进行苫盖，塔基区临时占地面积有所减少，因此密目网苫盖面积较方案设计减少 500m²；由于塔基基础施工时间较短，且都不在雨季施工，因此排水沟长度较方案设计减少 1220m，土质沉沙池较方案设计减少 19 座。

③牵张场及跨越场区：实际施工阶段，牵张场及跨越场未实施彩条布铺垫措施，改用了造价较低的密目网苫盖，但是实际工程量未发生变化。

④电缆施工区：实际施工阶段，电缆施工工程量小，且施工较快避开雨季，因此，土质排水沟较方案设计减少 240m，土质沉沙池较方案设计减少 2 座。

3.6 水土保持投资完成情况

3.6.1 水土保持投资落实情况

根据 2023 年 9 月 25 日，江苏省水利厅以《省水利厅关于准予江苏智纬电子

科技有限公司 110 千伏接入工程水土保持方案告知承诺制的行政许可决定》（苏水许可〔2023〕180 号）对本工程水土保持方案进行批复审核的水土保持总投资为 52.60 万元，其中工程措施 7.57 万元，植物措施 2.25 万元，临时措施 25.88 万元，独立费 6.61 万元，基本预备费 2.90 万元，水土保持补偿费 1.3853 万元。

3.6.2 水土保持投资变化情况

根据统计，本工程实际完成水土保持设施总投资 39.47 万元，其中工程措施投资 7.23 万元，植物措施投资 2.11 万元，临时工程投资 20.39 万元，独立费用 8.35 万元，基本预备费未启用，实际缴纳水土保持补偿费 1.3853 万元。

工程实际完成的水土保持投资较批复的水土保持投资减少了 13.13 万元，其中，工程措施投资比方案中减少了 0.34 万元；植物措施投资比方案中减少了 0.14 万元；临时措施投资与方案中相比减少了 5.49 万元；独立费用减少了 4.26 万元；基本预备费未启用；水土保持补偿费未发生变化，按照方案批复的数额进行缴纳。工程实际完成水土保持投资与方案设计投资对比表见表 3.6-1。

表 3.6-1 实际完成水土保持投资与方案设计投资对比表 （单位：万元）

序号	防治分区	方案投资	实际投资	变化情况
一	工程措施	7.57	7.23	-0.34
1	塔基区	4.46	4.12	-0.34
2	牵张场及跨越场区	1.40	1.40	0
3	施工道路区	0.46	0.46	0
4	电缆施工区	1.25	1.25	0
二	植物措施	2.25	2.11	-0.14
1	塔基区	1.12	0.98	-0.14
2	牵张场及跨越场区	0.69	0.69	0
3	施工道路区	0.18	0.18	0
4	电缆施工区	0.26	0.26	0
三	临时措施	25.88	20.39	-5.49
1	间隔扩建区	0.04	0	-0.04
2	塔基区	8.50	6.53	-1.97
3	牵张场及跨越场区	9.54	6.54	-3.00
4	施工道路区	6.80	6.80	0
5	电缆施工区	1.00	0.52	-0.48
四	独立费用	12.61	8.35	-4.26
1	建设管理费	0.72	0.65	-0.07
2	水土保持监理费	0.89	0.72	-0.17
3	设计费	5.00	5.00	0
4	水土保持设施验收费	6.00	4.98	-1.02

序号	防治分区	方案投资	实际投资	变化情况
5	水土保持监测费	0.00	0.00	0
五	第一至四部分合计	48.31	38.08	-10.23
六	基本预备费	2.90	0.00	-2.90
七	水土保持补偿费	1.3853	1.3853	0
八	水土保持总投资	52.60	39.47	-13.13

如表 3.6-1 所示，实际完成水土保持投资与方案设计投资比较，变化的主要原因有：

①工程措施投资变化：实际施工阶段，由于施工扰动范围减少，因此土地整治面积较方案设计减少 406m²。因此，工程措施投资总体较方案批复的投资有所减少。

②植物措施投资变化：实际施工阶段，该区占地面积减少，占用绿化带和空闲区域面积减少，可恢复植被面积减少，因此撒播草籽面积较方案设计减少 406m²。因此，植物措施投资总体是较方案批复的投资有所减少。

③临时措施投资变化：实际施工阶段，间隔扩建区未实施密目网苫盖；仅对裸露地表和临时堆土区域进行苫盖，塔基区临时占地面积有所减少，因此密目网苫盖面积较方案设计减少 500m²，牵张场及跨越场未实施彩条布铺垫，采用经济适用的密目网进行苫盖防护保护地表；由于塔基基础及电缆基础施工时间较短，且都不在雨季施工，因此排水沟长度较方案设计减少 1460m，土质沉沙池较方案设计减少 21 座。因此，临时措施投资总体较方案批复的投资有所减少。

④水土保持补偿费变化：水土保持补偿费按照方案批复费用缴纳，该部分投资未发生变化。

⑤独立费用投资变化：建设管理费减少了 0.07 万元，水土保持监理费减少了 0.17 万元，设计费未发生变化，水土保持设施验收费减少 1.02 万元。

⑥其他费用投资变化：基本预备费未启用，水土保持补偿费已足额按照批复缴纳，未发生变化。

4 水土保持工程质量

4.1 质量管理体系

水土保持工程建设、设计、施工、监理等单位详见表4.1-1。

表4.1-1 水土保持工程建设、设计、施工、监理等单位一览表

项目	单位名称	工作内容
建设单位	国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司	总体协调、组织
主体工程设计单位	扬州浩辰电力设计有限公司	水土保持措施设计、工艺管控
水土保持方案编制单位	江苏辐环环境科技有限公司	水土保持方案编制
水土保持监理单位	江苏兴力工程管理有限公司新兴分公司	主体工程、水土保持工程监理
水土保持监测单位	/	/
施工单位	扬州广源集团有限公司	土建施工
运营养护单位	国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司	全面负责

国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司将水土保持工作当做贯彻落实国家生态绿色工程建设的重要举措，水土保持工作与工程主体工作同等重要。在工程建设过程中，水土保持工作与主体工程贯彻“同时设计、同时施工、同时投产”的“三同时”要求。在施工过程中保护生态环境，减少水土流失。

(1) 建设单位

本项目建设单位为国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司，建设单位在建设过程中：

①建立健全工程水保工作管理体系，配备水保管理专职人员，负责本公司及受委托工程建设项目的水保管理工作。

②组织招投标工作，与各相关方签订合同。

③制订工程水土保持管理文件，并组织实施；审批业主项目部报审的水保管理策划文件；组织水土保持设计审查和交底工作；结合本公司安全质量培训，同步组织水保知识培训。

④依据批复的水保方案报告以及水保方案变更管理办法要求，组织梳理和收集工程重大水保变更情况（若有），及时上报重大设计变更情况和变更依据。

⑤组织或委托业主项目部开展工程水保中间验收，向水行政主管部门提交验收申请，配合水保专项验收。

⑥对于工程各级水保行政主管部门开展的检查，统一组织迎检，对提出的问题，组织限期整改并将整改情况书面报送主管部门。

⑦督促业主项目部落实工程项目的水保管理工作，组织或委托业主项目部开展工程项目水保管理评价考核工作。

⑧负责工程项目档案管理的日常检查、指导，组织工程项目档案的移交工作。

（2）设计单位

本项目设计单位为扬州浩辰电力设计有限公司，设计单位在主体工程和水土保持设计过程中：

①建立健全水保设计质量管理体系，执行水保设计文件的校审和会签制度，确保水保设计质量。

②依据批复的工程水保方案，与主体设计同时开展水保设计工作，设计深度满足水保工程建设要求。

③接受项目设计监理的管理，按照设计监理要求开展水保设计工作。

④按照批复的水保方案和重大水土保持变更管理办法要求，核实主体设计施工图图的差异，并对差异进行详细说明，并及时向相关建设单位和前期水保方案编制单位反馈信息。

⑤按规定派驻工地代表，提供现场设计服务，及时解决与水保相关的设计问题。

⑥在现场开展水保竣工自验收时，结合水保实施情况，提出水保目标实现和工程水保符合性说明文件，确保工程水保设施符合设计要求。

⑦配合或参与现场工程水保检查、水保监督检查、各阶段各级水保验收工作、水保事件调查和处理等工作。

（3）监理单位

本项目水土保持监理由主体工程监理单位江苏兴力工程管理有限公司新兴分公司，监理单位在建设过程中，严格履行以下职责和制度：

①技术文件审核、审批制度。监理单位应依据合同约定对施工图纸和施工单位提供的施工组织设计、开工申请报告等文件进行审核或审批。

②材料、构配件和工程设备检验制度。监理单位应对进场的材料、苗木、籽种、构配件及工程设备出厂合格证明、质量检测报告进行核查，并责令施工或采

购单位负责将不合格的材料、构配件和工程设备在规定时限内运离工地或进行相应处理。

③工程质量检验制度。施工单位每完成一道工序或一个单元、分部工程都应进行自检，合格后方可报监理机构进行复核检验。上一单元、分部工程未经复核检验或复核检验不合格，不应进行下一单元、分部工程施工。

④工程计量与付款签证制度。按合同约定，所有申请付款的工程量均应进行计量并经监理机构确认。未经监理机构签证的工程付款申请，建设单位不应支付。

⑤工地会议制度。工地会议由总监理工程师或总监理工程师代表主持，相关各方参加并签到，形成会议纪要需分发与会各方。工地例会每月定期召开一次，水土保持工程参建各方负责人参加，由总监理工程师或总监理工程师代表主持，并形成会议纪要。会议应通报工程进展情况，检查上一次工地例会中有关决定的执行情况，分析当前存在的问题，提出解决方案或建议，明确会后应完成的任务。监理机构应根据需要，主持召开工地专题会议，研究解决施工中出现的涉及工程质量、二程进度、工程变更、索赔、安全、争议等方面的专门问题。

⑥工作报告制度。监理机构应按双方约定的时间和渠道向建设单位提交项目监理月报（或季报、年度报告）；在单位工程或单项工程验收时提交监理工作报告，在合同项目验收时提交监理工作总结报告。

⑦工程验收制度。在施工单位提交验收申请后，监理机构应对其是否具备验收条件进行审核，并根据有关规定或合同约定，参与、协助建设单位组织工程验收。

（4）施工单位

本项目主体工程以及水土保持设施施工单位为扬州广源集团有限公司。施工单位均有完整的、运转正常的质量保证体系，各项管理制度完整，质检部门的人员配备能满足工程现场质量管理工作的需要；认真执行国家和行业的有关工程质量的监督、检查、验收、评定方面的方针、政策、条例、法规、规程、规范、标准和设计单位提供的施工图纸、技术要求、技术标准、技术文件等；遵守业主发布的各项管理制度，接受业主、施工监理部的质量监督和检查；做好监检中的配合工作和监检后整改工作；工程开工前有针对性的制定工程的实施方案及实施纲要、施工组织设计（包括总设计、专业设计）、质量验评范围划分表、图纸会审

纪要、技术交底记录、质量通病的预防计划（质量工作计划）、重点项目、关键工序的质量保证措施施工方案，上述各项需在开工前提交给施工监理部审核，监理部在开工前送业主审批，以取得业主的认可，经监理部、业主认可方可进行正式施工；在进场后施工前向施工监理部报送质保体系和质检人员的名单和简历、特种作业和试验人员的名单及持证证号，以备案与复查:按规定做好施工质量的分级检验工作，不同级别不合并检验，不越级检验，不随意变更检验标准与检验方法；按规定做好计量器具的验定工作，保证计量器具在验定周期内，并努力做到施工计量器具与检验计量器具分开；对业主和施工监理部发出的《工程质量问题通知单》、《不符合项通知单》等整改性文件认真及时处理，并按规定的程序，及时反馈；按规定做好质量记录事故的登录、一般质量事故的调查、分析、处理和重大质量事故的上报工作；及时做好各项工程施工质量的统计工作，并在规定时间内送往施工监理部审阅，施工监理部汇总后报送业主，其内容包括质量验评、技术检验和试验、施工质量问题、设备与原材料质量问题以及次月质量工作计划。

4.2 各防治分区水土保持工程质量评定

4.2.1 项目划分及结果

本项目质量评估的主要依据为施工过程材料、分部工程竣工资料等。水土保持措施的质量评定采用现场检查，查阅自检成果及交工验收报告数据等。

主要检查了本项目各阶段水土保持措施的执行情况，查看了施工原始记录，工程管理文件，分别检查了项目区土地整治等分项单元工程中间交验证书，原材料试验报告，单位分部工程质量检验评定表；混凝土、砂浆配合比试验报告；原材料、外购成品、半成品抽检、试验资料；冲击实试验报告；水土保持工程措施、植物措施的设计、设置及材料规格、质量、开工报告等。检查了各阶段的施工总结报告、竣工验收资料等资料，并对现场情况进行了核查。

依据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）的规定，本项目水土保持工程项目划分为土地整治、植被建设 2 个单位工程；场地整治、点片状植被 2 个分部工程；土地整治、撒播草籽 8 个单元工程。工程措施项目划分标准见表 4.2-1。

表4.2-1 水土保持工程质量评定项目划分表

单位工程	分部工程	划分原则	单元工程	单元工程数量
土地整治工程	场地整治	每 0.1hm ² ~1hm ² 作为一个单元工程，不足 0.1hm ² 的可单独作为一个单元工程，大于 1hm ² 的可划分为 2 个以上单元工程	塔基区土地整治	1
	场地整治		牵张场及跨越场区土地整治	1
	场地整治		施工道路区土地整治	1
	场地整治		电缆施工区土地整治	1
植被建设工程	点片状植被	以图斑作为单元工程，每 0.1hm ² ~1hm ² 作为一个单元工程	塔基区撒播草籽	1
	点片状植被		牵张场及跨越场区撒播草籽	1
	点片状植被		施工道路区撒播草籽	1
	点片状植被		电缆施工区撒播草籽	1
合计				8

4.2.2 各防治分区工程质量评定

江苏智纬电子科技有限公司110千伏接入工程水土保持设施质量评定工作由国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司统一组织，水土保持设施验收技术服务单位提供技术支持，单元工程质量由施工单位质检部门组织评定，监理单位复核。监理单位提供单元工程抽检验收资料及与之相关的其他过程资料，各设计单位、施工单位配合开展工作。主体监理单位、设计单位、施工单位、建设单位及各业主项目部，共同研究确定水土保持工程质量评定等级。

（1）水土保持质量评定情况

依据《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）之规定，水土保持工程质量等级分为“合格”、“优良”两级，评判标准如下：“合格”的标准为：单元工程质量全部合格，中间产品质量及原材料质量全部合格。“优良”的标准为：①单元工程质量全部合格，其中有50%以上达到优良，主要单元工程、重要隐蔽工程及关键部位的单元工程质量优良，且未发生过质量事故。②中间产品和原材料质量全部合格。水土保持工程总体评定为合格。

（2）现场查勘外观质量评定情况

根据工程建设特点，按照《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）和《生产建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490-2016）要求，验收小组对调查对象进行项目划分，重点检查以下内容：

- ①核查已实施的水土保持设施规格尺寸和分部工程施工用料；
- ②现场核查水土保持措施是否存在缺陷，是否存在因施工不规范、人为破坏

等因素造成破损、变形、裂缝、滑塌等现象，并进一步确定采取的补救措施。

③现场检查水土保持设施是否达到设计要求，确定施工技术要点的落实和建设单位的管护情况。

④重点抽查变电站改造区、塔基区等水土保持设施建设情况、运行情况及水土流失防治效果，是否存在明显的水土流失现象。

⑤结合监理工程质量评定和现场核查情况，综合评估水土保持设施是否达到设计要求，是否达到水土保持设施设计的防治效果，并对工程质量等级进行评定。本次评估主要查阅了土地整治、植被建设、防洪排导、降水蓄渗等水土保持工程设施的主材料及中间产品的试验报告资料，分部工程、单位工程、分项工程等质量检验评定表及隐蔽工程检查记录等资料，以及施工管理制度、招投标文件、工程初步设计报告、施工图设计、施工总结、监理工作报告等项目竣工文件。在各参建单位的努力下，分部工程和单位工程的自查初验工作已完成，分部工程、单位工程质量评定结果详见表4.2-2。

各核查单元工程质量评定全部为合格，水土保持工程质量评定结果见表4.2-2。

表4.2-2 水土保持工程质量评定结果汇总

防治分区	单位工程	分部工程		单元工程			
		工程名称	质量评定	措施名称	数量	合格数	合格率
塔基区	土地整治	场地整治	合格	土地整治	1	1	100%
	植被建设	点片状植被	合格	撒播草籽	1	1	100%
牵张场及跨越场区	土地整治	场地整治	合格	土地整治	1	1	100%
	植被建设	点片状植被	合格	撒播草籽	1	1	100%
施工道路区	土地整治	场地整治	合格	土地整治	1	1	100%
	植被建设	点片状植被	合格	撒播草籽	1	1	100%
电缆施工区	土地整治	场地整治	合格	土地整治	1	1	100%
	植被建设	点片状植被	合格	撒播草籽	1	1	100%
合计					8	8	100%

4.2.3 弃渣场稳定性评估

该工程未设置弃渣场，不涉及弃渣场稳定性评估相关内容。

4.3 总体质量评价

经建设单位组织相关单位开展自查初验，本项目水土保持工程质量评定结果如下：

（1）单元工程

通过对工程现场实际量测检验、查看检测检验资料，工程资料齐全，检查项

目符合质量标准；检测项目的合格率 100%。

（2）分部工程

通过对工程外观质量实际量测检验、查看单元工程检测检验资料。单元工程全部合格，保证资料完善齐备，原材料及中间产品质量合格，分部工程质量全部合格，合格率 100%。

（3）单位工程

通过对工程外观质量实际量测检验、查看单元工程检测检验资料。分部工程质量全部合格；中间产品质量及原材料质量全部合格；大中型工程外观质量得分率达到 80%以上；施工质量检验资料基本齐全。单位工程全部合格，合格率 100%。

经过建设单位自查初验，验收单位资料检查和现场抽查，认为本项目已完成的各项水土保持设施质量合格。满足水土保持方案报告及规范规程对水土保持设施质量的要求。

5 项目初期运行及水土保持效果

5.1 初期运行情况

在工程的运行过程中，国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司建立了一系列的规章制度和管护措施，实行水土保持工程管理、维修、养护目标责任制，各部门各司其职，分工明确，各区域的管护落实到人，奖罚分明，从而为水土保持措施早日发挥其功能奠定了基础。

本项目的运行管护责任由国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司承担。

本项目自竣工以来，各项水土保持工程措施、临时措施均已经受度汛，未出现损坏，运行情况良好。水土保持植物措施对扰动后恢复的立地条件适应良好。

各项水土保持工程措施暂未出现破损和需要维修补植的问题，水土保持植物措施局部补植整改后，长势良好。

从目前运行情况来看，水土保持措施运行正常，林草长势良好，项目周围的环境有所改善，初显防护效果。运行期的管理维护责任落实，可以保证水土保持设施的正常运行，并发挥作用。

5.2 水土保持效果

5.2.1 批复的防治目标值

根据苏水许可〔2023〕180号，本项目批复的水土保持方案提出的防治目标为水土流失防治执行南方红壤区一级标准，设计水平年防治目标：水土流失治理度 98%，土壤流失控制比 1.0，渣土防护率 98%，表土保护率 92%，林草植被恢复率 98%，林草覆盖率 27%。

5.2.2 完成的防治目标值

根据验收等相关信息，完成的防治目标值为：①水土流失治理度 99.43%；②土壤流失控制比 3.4；③渣土防护率 99.94%；④表土保护率 98.60%；⑤林草植被恢复率 99.29%；⑥林草覆盖率 95.60%。

（1）水土流失治理度

工程建设期间累计扰动土地面积为 13447m²，水土流失面积 13447m²，工程占地范围内水土保持治理达标面积共 13371m²，计算得水土流失治理度为 99.43%，达到水土保持方案批复的 98%的防治目标，水土流失治理度计算见表 5.2-1。

表5.2-1 各区域水土流失治理度情况表（单位：m²）

防治分区	扰动土地面积	水土流失面积	水土流失治理达标面积				水土流失治理度
			建筑物覆盖面积、硬化面积	工程措施	植物措施	小计	
间隔扩建区	110	110	110	0	0	110	99.43%
塔基区	6207	6207	80	1006	5121	6207	
牵张场及跨越场区	3400	3400	0	0	3390	3390	
施工道路区	1120	1120	0	230	830	1060	
电缆施工区	2610	2610	242	1097	1265	2604	
合计	13447	13447	432	2333	10606	13371	
防治标准							98%
是否达标							达标

（2）土壤流失控制比

工程区域容许土壤流失量为 500t/（km²·a）。根据调查结果显示，在施工过程中基础施工阶段土壤侵蚀量比较大。但由于工程各个区域在整个工程施工完毕后被建筑物覆盖或者植被覆盖，工程结束后，水土流失量逐渐变小，绿化工程等各项水土保持措施水土保持效益日趋显著。工程完工后，整个项目区平均土壤侵蚀强度达到 145t/（km²·a），各项水土保持措施较好地发挥了防治作用。土壤流失控制比约为 3.4，达到方案设计 1.0 的防治目标。

（3）渣土防护率

本工程临时堆放的土方采取了苫盖等措施，不设弃渣场。本工程建设期永久弃渣量及临时堆土总量为 4893m³，实际挡护的永久弃渣量及临时堆土数量为 4890m³，渣土防护率为 99.94%，达到方案要求的 98%的防治目标。

（4）表土保护率

根据查阅施工组织设计资料及施工单位相关现场资料分析，并结合现场调查，本工程对剥离的表土进行了苫盖等临时措施。项目区实际可剥离表土面积 13337m²，可剥离表土量为 4001m³；实际通过剥离保护的表土面积为 2717m²，实际剥离保护的表土量为 815m³；通过苫盖保护的表土面积为 10433m²，实际通过苫盖保护的表土量为 3130m³，表土保护率 98.60%，达到方案要求的 92%的防治目标。

（5）林草植被恢复率

本工程项目建设区内可恢复林草植被面积为 10682hm²，实际实施林草类植

被面积为 10606m²。经计算，林草植被恢复率为 99.29%，达到方案要求的 98% 的目标值。详见表 5.2-2。

表5.2-2 林草植被恢复率统计表

防治分区	可恢复植被面积 (m ²)	林草类植被面积 (m ²)	林草植被恢复率 (%)
塔基区	5121	5121	99.29
牵张场及跨越场区	3400	3390	
施工道路区	890	830	
电缆施工区	1271	1265	
合计	10682	10606	
防治标准			98
是否达标			达标

(6) 林草覆盖率

本工程项目建设区面积为 13447m²，扣除恢复耕地后面积 11094m²，林草类植被面积 10606m²，经计算，林草覆盖率为 95.60%，达到方案要求的 27% 的目标值。

表5.2-3 林草覆盖率统计表

防治分区	项目区面积 (m ²)	恢复耕地 面积 (m ²)	扣除恢复 耕地后面积 (m ²)	林草类植 被面积 (m ²)	林草覆 盖率 (%)	防治标 准 (%)	是否达 标
间隔扩建区	110	110	110	0	95.60	27	达标
塔基区	6207	6207	5181	5121			
牵张场及 跨越场区	3400	3400	3400	3390			
施工道路 区	1120	1120	890	830			
电缆施工 区	2610	2610	1513	1265			
合计	13447	13447	11094	10606			

(7) 六项指标防治效果与目标值比较

通过采取相应的水土保持措施，本项目完成的防治目标值为：水土流失治理度 99.43%，土壤流失控制比 3.4，渣土防护率 99.94%，表土保护率 98.60%，林草植被恢复率 99.29%，林草覆盖率 95.60%。各项指标防治效果值与方案设计目标值对照表详见表 5.2-4。

表5.2-4 六项指标防治效果值与方案设计目标值对照表

序号	指标	目标值	验收结果	达标情况
1	水土流失治理度（%）	98	99.43	达标
2	土壤流失控制比	1.0	3.4	达标
3	渣土防护率（%）	98	99.94	达标
4	表土保护率（%）	92	98.60	达标
5	林草植被恢复率（%）	98	99.29	达标
6	林草覆盖率（%）	27	95.60	达标

6 水土保持管理

6.1 组织领导

（1）建立了健全的水土保持组织领导体系

建设单位根据实施方案，设立了专人负责本水土保持方案的组织、管理及实施工作，及时掌握工程水土保持工程实施情况。在施工期间配合地方水行政主管部门对本建设项目水土保持措施实施情况进行监督和管理，做好本工程的水土保持工作。

（2）组织水土保持法律、法规的学习、宣传工作，提高各级技术人员水土保持意识建设单位定期开展了《中华人民共和国水土保持法》、《江苏省水土保持条例》等法律、法规的学习，并对施工单位进行水土保持的宣传活动和相关知识的普及。使得在项目建设过程中，施工人员能按照水土保持实施方案中要求施工，并有意识的防止水土流失。

（3）明确职责、做好本水土保持方案的实施监督工作

建设单位定期将水土保持工作的进度情况向建设单位汇报，建设单位也主动接受地方水行政主管部门的监督检查，并根据意见及时进行调整。

6.2 规章制度

水土保持方案实施过程中应采取“三制”质量保证措施，即实行项目管理制、工程招投标制和工程监理制。认真贯彻“三同时”制度，以保证水保方案的顺利实施，并达到预期目的。

（1）加强对施工单位领导的管理，严格控制施工作业范围红线，制定相应的处罚制度，落实水土保持责任。

（2）加强对施工技术人员水土保持法律、法规的宣传工作，提高水土保持法律意识，形成全社会支持水土保持生态环境建设的局面。

（3）工程措施施工时，对施工质量进行检查，对不符合设计要求和质量要求的工程验收的水土保持工程进行检查观测。

（4）植物措施施工时，加强植物措施的后期抚育工作，抓好植物的抚育和管护，清除杂草，确保各种植物的成活率，发挥植物措施的水土保持效益。

6.3 建设管理

项目建设过程中，就严格执行了项目法人制，招标投标制，建设监理制和合同管理制，依据《建设项目质量管理办法》的规定，细化和强化质量意识、建立健全了《质量保证体系》、《工程质量责任体系》、《信息指令执行反馈体系》、《质量检查考核体系》、《工程质量动态报告体系》等，将水土保持工程的建设和管理纳入高标准、规范化管理模式和程序中，开展项目水土保持监理和自验工作；同时，业主单位在工程建设过程中指派专人负责，项目法人、设计单位、施工单位、监理单位相互协调，强化了对水土保持工程的管理，实行了“项目法人对国家负责，监理单位控制，承包商保证，政府监督”的质量管理体系，以确保水土保持方案的顺利实施。对水土流失防治责任区内的水土流失进行着全面、系统的整治，完成了水土保持方案确定的防治任务，使施工过程中的水土流失得到有效控制。已完成的各项措施运行正常，对防治人为水土流失起到了较好的作用。

6.4 水土保持监测

根据《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保〔2020〕161号），未对编制水土保持方案报告表的项目作出开展水土保持监测工作的要求。

6.5 水土保持监理

本项目水土保持监理由主体工程监理单位江苏兴力工程管理有限公司新兴分公司代为进行，该项目具有水土保持功能的设计内容施工均在主体工程监理单位监理下完成，并完成了监理总结报告。

a) 监理情况

主体工程监理单位江苏兴力工程管理有限公司新兴分公司承担了本工程水土保持监理工作。监理单位在施工完成后统计工程量并对外观质量进行评定。监理采用旁站监理和实地调查的方法。现场监理过程中发现工程缺陷或遗留问题及时向建设单位提出整改要求，保证了各项治理工程的顺利发挥后续治理效益。

b) 监理内容

主体工程监理单位对于本工程完成的监理内容包括：1）会同建设单位明确了水土保持防治责任范围和分区。2）对水土保持工程量、工程完成质量进行确

认，对水土保持工程质量做出综合评价。3）对水土保持投资进行控制并进行综合评价。4）对工程进度进行控制并做出综合评价。

c) 监理工作的合理性分析

验收组认为监理单位确定的水土保持工程量正确，质量评定情况合理，投资核定情况符合事实，综合结论正确。工程水土保持投资结算，纳入到主体工程管理体系中，资金支付资金划分较为复杂，对于纳入到主体工程这部分资金，主要由项目建设单位和主体工程监理单位负责协调处理。

因此，本工程水土保持防治责任范围、工程量的确定，水土保持工程质量的评定和投资的统计复核工程建设实际情况，综合结论合理、准确。

6.6 水行政主管部门监督检查意见落实情况

本工程未收到水行政主管部门监督检查意见。

6.7 水土保持补偿费缴纳情况

建设单位依据批复的水土保持方案要求缴纳了水土保持补偿费 13853 元，缴纳凭证见附件 6。

6.8 水土保持设施管理维护

工程移交运行后，由国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司负责运行维护，具体责任岗位为水保专责。

运行管理具体工作由国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司开展。若水土保持设施存在缺陷或出现损坏时，质保期内由施工单位负责修复，质保期后由国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司负责处理。

目前各项水土保持设施运行情况良好。暂未出现水土保持设施损坏现象，植物措施长势良好，满足水土保持要求。

7 结论

7.1 结论

通过组织对本项目实施全面的水土保持设施调查,我公司针对本项目水土保持设施建设情况,主要形成以下结论:

1)建设单位十分重视工程建设中的水土保持工作,按照有关水土保持法律、法规的规定,编报了水土保持方案报告表,并上报水行政主管部门审查、批复。各项手续齐全。

2)本工程水土保持工作制度完善,档案资料保存完整,水土保持工程设计、施工、监理、财务支出等资料齐全。

3)各项水土保持设施按批准的水土保持方案及其设计文件建成,符合主体工程和水土保持的要求,达到了批准的水土保持方案和批复文件的要求,水土流失防治效果达到了《生产建设项目水土流失防治标准》(GB/T 50434-2018)等相关技术标准的要求,水土保持设施运行正常。

4)水土保持设施建设质量合格,工程措施结构稳定、排列整齐、外型美观;植物绿化生长良好,林草覆盖率达到了较高的水平;工程评定资料齐全,完成情况良好。水土保持工程措施和植物措施合格率均达到 100%,本项目水土保持设施质量评定为合格。

5)本项目水土保持措施落实情况良好,水土保持防治效果明显,工程水土流失防治责任范围内的水土流失得到了较为有效的治理。

6)水土保持投资使用符合审批要求,管理制度健全。

7)水土保持设施的后续管理、维护措施已经落实,具备正常运行条件,且能持续、安全、有效运转,符合交付使用要求。

综上所述,本工程水土保持设施建设符合国家水土保持法律法规及技术规范的有关规定和要求,水土保持工程总体工程质量合格,达到了水土保持方案及批复的要求,水土保持设施自验结论为合格,具备水土保持验收条件。

7.2 遗留问题安排

本工程无遗留问题。

7.3 下阶段工作安排

- 1) 加强水土保持设施管理维护工作，加强植被措施的抚育、管护和补植。
- 2) 对本项目水土保持工作开展情况过程进行分析总结，进一步促进后续项目水土保持工作的科学化管理。

附件 1: 项目建设及水土保持大事记

江苏智纬电子科技有限公司 110 千伏接入工程项目建设及水土保持大事记

2023 年 6 月 15 日,江苏省发展和改革委员会以《省发展改革委关于苏州沈塘 220 千伏输变电工程等电网项目核准的批复》(苏发改能源发〔2023〕646 号)通过了本工程核准;

2023 年 7 月 27 日,国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司以《国网扬州供电公司关于江苏智纬电子科技有限公司 110 千伏接入工程初步设计的批复》(扬供电建〔2023〕183 号)通过了本工程初设;

2023 年 9 月 25 日,江苏省水利厅以《省水利厅关于准予江苏智纬电子科技有限公司 110 千伏接入工程水土保持方案告知承诺制的行政许可决定》(苏水许可〔2023〕180 号)对本工程水土保持方案进行批复;

2023 年 11 月,工程正式开工;2024 年 3 月,工程正式完工。

2024 年 4 月,受建设单位委托,江苏嘉溢安全环境科技服务有限公司(我单位)承担了本工程水土保持验收工作。2024 年 5 月,验收调查单位编制完成水土保持设施验收报告。

2024 年 6 月,建设单位组织施工、设计、监理、水土保持设施验收单位对本工程开展了电网建设项目水土保持设施竣工验收检查,形成了检查记录表。2024 年 7 月,受国网江苏省电力有限公司建设部委托,国网江苏省电力有限公司经济技术研究院组织开展本工程水土保持设施验收技术审评及现场检查。

江苏省发展和改革委员会文件

苏发改能源发〔2023〕646号

省发展改革委关于苏州沈塘220千伏输变电工程等电网项目核准的批复

国网江苏省电力有限公司：

你公司《关于苏州沈塘220千伏输变电工程等电网项目核准的请示》（苏电发展〔2023〕215号）及相关支持性文件收悉。经研究，现就核准事项批复如下：

一、为更好地服务地方经济发展，满足用电负荷增长和电源送出的需求，加强地区电网结构，进一步提高供电质量，同意建设苏州沈塘220千伏输变电工程等电网项目。你公司作为项目法人，负责项目建设、经营及贷款本息偿还。

二、本批项目建设规模包括：建设220千伏变电容量72万千伏安，扩建220千伏间隔11个，新建及改造220千伏线路76.86公里；扩建110千伏间隔1个，新建及改造110千伏线路33.86公里；扩建35千伏间隔3个，新建及改造35千伏线路15.07公里。核准项目具体建设内容和相关支持文件见附件1。

三、按2022年价格水平测算，本批项目静态总投资93915万元，动态总投资约95000万元。其中，资本金不低于动态投资的20%，由你公司以自有资金出资，其余由你公司融资解决。

四、本批项目在工程设计、建设及运行中要落实各项安全、环保和节能等措施，满足国家安全规范、环保标准和节能要求等规定。要切实加强安全生产管理，严格执行“三同时”制度，按照相关规章制度压实项目建设和相关责任主体安全生产及监管责任，严防安全生产事故。要加强施工环境分析，认真排查并及时消除项目本身与周边设施相交相邻等可能存在的安全隐患，不得在未采取有效处理措施的情况下开展建设。

五、本批项目工程设备采购及建设施工要按《招标投标法》和有关招标规定，采用规范的公开招标方式进行。

六、如需对本核准文件所规定的内容进行调整，请及时以书面形式向我委报告，并按照规定办理。

七、请你公司根据本核准文件，办理城乡规划、土地使用、安全生产等相关手续，满足开工条件后开工。

八、本核准文件自印发之日起有效期限2年。在核准文件有

效期内未开工建设的，项目单位应在核准文件有效期届满前30个工作日之前向我委提出延期申请。项目在核准文件有效期内未开工建设也未按规定申请延期的，或虽提出延期申请但未获批准的，本核准文件自动失效。

- 附件：1. 苏州沈塘220千伏输变电工程等电网项目表
2. 工程建设项目招标事项核准意见表
3. 工程项目代码一览表
4. 电力项目安全管理和质量管控事项告知书

江苏省发展改革委

2023年6月15日

抄送：国家能源局江苏监管办，省生态环境厅、自然资源厅，苏州市、无锡市、连云港市、徐州市、泰州市、常州市、扬州市、南京市发展改革委。

江苏省发展和改革委员会办公室

2023年6月16日印发

序号	项目名称	建设规模			投资规模		支持性文件			备注		
		变电	线路	间隔	静态	动态	规划选址	环境保护	稳评批复		土地预审(公顷)	
											文号	征地面积
							展局、国家东中西 区域合作示范区 (连云港徐圩新 区)建设局 2022 年 9 月 26 日	2022 年 12 月 12 日 的初审意见		连云港市不动产 权第 0061132 号		
3	江苏徐州大庙唯宁变电站 100 兆瓦渔光 互补光伏发电项目 110 千伏送出工程		1.20		423	426	唯宁县自然资源和 规划局 2023 年 4 月 18 日	徐州市生态环境局 2023 年 5 月 17 日初 审意见	唯宁县坡城镇人民 政府意见征求表	唯土国用(2010) 第 02545 号、唯 国用(2007)字 第 80080 号		
4	江苏苏州昆山鼎昌鑫电子科技有限公司 110 千伏变电站配套工程		7.73		5348	5391	昆山市自然资源和 规划局 2023 年 6 月 6 日	苏州市生态环境局 2023 年 5 月 26 日的 复函	昆稳评办备[2023]1 号	根据《江苏省电 力条例》，线路 工程不征地	注 2	
5	江苏苏州迈为科技股份有限公司 110 千 伏变电站配套工程		0.93		1508	1520	编号: 2023-004	苏州市生态环境局 2023 年 5 月 26 日的 复函	吴江经济技术开发区 管理委员会稳评 评审表	根据《江苏省电 力条例》，线路 工程不征地	注 3	
6	常州恒立精密传动线性驱动器项目 110 千伏接入工程		0.64		672	678	常州市自然资源和 规划局武进分局 2023 年 3 月 30 日	常环核初审[2023]1 号	武进国家高新技术 产业开发区管理委 员会稳评评审表	根据《江苏省电 力条例》，线路 工程不征地	注 4	
7	徐州皖星碳材料年产 26400 吨碳材料项 目 110 千伏接入工程		3.05		1476	1488	新沂市自然资源和 规划局 2023 年 3 月 30 日、新沂市规建市 政 202300002 号	徐州市生态环境局 2023 年 4 月 21 日初 审意见	江苏新沂经济开发 区管理委员会意见 征求表	苏(2018)新沂 市不动产第 0028043 号	注 5	
8	江苏智纬电子科技有限公司 110 千伏接 入工程		5.71		1951	1967	邮自资[2022]145 号、高邮市自然资 源局 2023 年 3 月 27 日的 复函	扬州市生态环境局 2023 年 3 月 27 日的 复函	邮政发[2023]29 号	邮国用(2013) 第 06442 号	注 6	

序号	项目名称	项目代码
9	江苏徐州大唐唯宁陵城镇 100 兆瓦渔光互补光伏发电项目 110 千伏送出工程	2306-320000-04-01-110706
10	江苏苏州昆山鼎昌鑫电子科技有限公司 110 千伏变电站配套工程	2305-320000-04-01-382081
11	江苏苏州迈为科技股份有限公司 110 千伏变电站配套工程	2305-320000-04-01-130379
12	常州恒立精密传动线性驱动器项目 110 千伏接入工程	2305-320000-04-01-947595
13	徐州皖星碳材料年产 26400 吨碳材料项目 110 千伏接入工程	2305-320000-04-01-830916
14	江苏智纬电子科技有限公司 110 千伏接入工程	2305-320000-04-01-955021
15	江苏扬州深能高邮三垛 30 兆瓦分散式风电项目 35 千伏送出工程	2304-320000-04-01-538697
16	江苏南京北冶功能材料（江苏）有限公司高温合金和高端金属材料生产项目 35 千伏 配套接入工程	2304-320000-04-01-217901
17	常州合金生命高端创新药合成研发基地项目 35 千伏接入工程	2306-320000-04-01-228605
18	徐州徐工基础工程机械有限公司基础工程机械智能制造基地项目 35 千伏接入工程	2306-320000-04-01-898071

江苏省水利厅行政许可决定书

苏水许可〔2023〕180号

省水利厅关于准予江苏智纬电子科技有限公司 110千伏接入工程水土保持方案 告知承诺制的行政许可决定

高邮城南经济新区管理委员会：

你单位于2023年9月18日以告知承诺制方式申请的江苏智纬电子科技有限公司110千伏接入工程水土保持方案行政许可，我厅于2023年9月21日受理（苏水许受〔2023〕180号）。经形式审查，提交的要件材料符合要求，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《中华人民共和国水土保持法》第二十五条第一款的规定，决定准予行政许可。

一、该项目以“告知承诺制”方式进行审批，我厅不对项目水土保持方案报告表具体内容进行实质审查。你单位是项目水土流失防治责任主体，按照《水土保持行政许可承诺书》及水土保持方案报告表内容开展水土保持相关工作。如在水土保持工作中未按照规定要求以及承诺书内容履行相关责任和义务，由此导致的所有法律责任由你单位自行承担。

二、项目如发生地点、规模、水土保持措施及弃渣存放

地等重大变更，须报本厅重新审批，其他涉及水土保持方案的变更须报本厅备案。我厅将按照《省政府办公厅关于全面推行证明事项告知承诺制实施方案的通知》（苏政办发〔2020〕84号）要求加强项目事中事后监管，对你单位履行承诺情况进行监督检查。对不实承诺或者未履行承诺的，按规定开展责任追究和信用惩戒。扬州市及高邮市水行政主管部门应加强对辖区内水土保持方案实施情况的跟踪检查。

三、项目完工后你单位应当按照《江苏省生产建设项目水土保持管理办法》开展水土保持设施自主验收，验收结束后将验收材料向我厅报备。未经验收或验收不合格的，生产建设项目不得投产使用。

四、项目建设如涉及其他行政许可事项的，应当依法办理相应审批手续。

五、根据《财政部关于水土保持补偿费等四项非税收入划转税务部门征收的通知》《省政府印发关于推动经济运行率先整体好转若干政策措施的通知》等相关规定，在项目开工前需向税务机关一次性缴纳水土保持补偿费共计11082元（省级收入）。



抄送：扬州市水利局，高邮市水利局。

普通事项

国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司文件

扬供电建〔2023〕183号

国网扬州供电公司关于江苏智纬电子科技有限公司 110 千伏接入工程初步设计的批复

项目管理中心,国网高邮市供电公司:

根据公司初步设计评审计划安排,江苏智纬电子科技有限公司 110 千伏接入工程已由国网江苏经研院完成评审。结合《国网江苏省电力有限公司经济技术研究院关于江苏智纬电子科技有限公司 110kV 接入工程初步设计的评审意见》(苏电经研院技术〔2023〕247号),经研究,原则同意上述工程初步设计。现批复如下:

一、建设规模及主要技术方案

本工程包括 3 个单项工程:勤王 220 千伏变电站 110 千伏间

隔改造、智纬科技~勤王 110 千伏线路（架空电气）、智纬科技~勤王 110 千伏线路（电缆电气）。

（一）勤王 220kV 变电站 110 千伏间隔改造工程

本期勤王 220 千伏变电站将 110 千伏备用 7I5 间隔调整为智纬电子间隔；增加三相电压互感器。

（二）智纬科技~勤王 110 千伏线路工程（架空电气）

本期新建双回单架线路 2.739 公里。导线采用 $1 \times \text{JL3/G1A-400/35}$ 钢芯铝绞线。新建杆塔 19 基。架空线路土建部分由政府出资，采用钻孔灌注桩基础形式。

（三）智纬科技~勤王 110 千伏线路工程（电缆电气）

本期新建单回线路 0.248 公里。电缆采用单芯铜导体交联聚乙烯绝缘、皱纹铝护套、PE 外护套 C 级阻燃电缆，导体截面为 800mm^2 。电缆线路土建部分由政府出资，采用新建电缆排管、电缆沟井敷设。

二、概算投资

工程概算动态投资 902 万元（概算汇总表见附件 1）。工程技术方案及概算投资详见评审意见（附件 2）。

工程建设单位要切实加强工程建设管理，有效控制工程造价，严格按照初步设计批复开展工程建设。

- 附件：1. 江苏智纬电子科技有限公司 110 千伏接入工程初设概算汇总表
2. 《国网江苏省电力有限公司经济技术研究院关于江苏智纬电子科技有限公司 110kV 接入工程初步设计的评审意见》（苏电经研院技术〔2023〕247 号）



（此件不公开发布，发至收文单位本部及所属二级单位机关。未经公司许可，严禁通过微信等任何方式对外传播和发布，任何媒体或其他主体不得公布、转载，违者追究法律责任。）

附件1

江苏智纬电子科技有限公司110千伏接入工程初设概算汇总表

序号	工程名称	建设规模	初设概算（万元）				备注
			动态投资	静态投资	场地征用 及清理费	基本 预备费	
1	江苏智纬电子科技有限公司110千伏接入工程		902	895	4	13	
(1)	勤王220千伏变电站110千伏间隔改造工程	间隔改造	88	87	0	1	
(2)	智纬科技~勤王110千伏线路工程（架空电	1×JL3/G1A-400/35 2×2.739（预留一回）km	656	651	2	10	
(3)	智纬科技~勤王110千伏线路工程（电缆电	800mm2电缆 0.248km	158	157	2	2	

附件 5、单位、分部工程验收鉴定书

生产建设项目水土保持设施

单位工程验收鉴定书

生产建设项目名称：江苏智纬电子科技有限公司 110 千伏接入工程

单位工程名称：土地整治工程

所含分部工程名称：场地整治

2024 年 6 月

生产建设项目水土保持设施

单位工程验收鉴定书

项目名称：江苏智纬电子科技有限公司 110 千伏接入工程

单位工程：土地整治工程

建设单位：国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司

设计单位：扬州浩辰电力设计有限公司

施工单位：扬州广源集团有限公司

监理单位：江苏兴力工程管理有限公司新兴分公司

验收日期：2024 年 6 月

验收地点：江苏省

前言

根据《生产建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490-2016）以及《水土保持质量评定规程》（SL336-2006）等相关水土保持工程建设法律法规，2024年6月，国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司组织，在江苏省扬州市对江苏智纬电子科技有限公司110千伏接入工程水土保持单位工程进行了自查初验。参加单位还有设计单位扬州浩辰电力设计有限公司、施工单位扬州广源集团有限公司、监理单位江苏兴力工程管理有限公司新兴分公司等。验收组成员通过查看工程现场、查阅施工文字资料、影像资料，听取设计单位、施工单位、监理单位的情况汇报后，进行了讨论，并形成验收意见，一致通过验收，并填写签发了《单位工程验收鉴定书》：

一、工程概况

（一）工程位置（部位）及任务

1、工程位置

本工程位于扬州市高邮市高邮城南经济新区（车逻镇）。

2、建设任务

本工程分为点型工程和线型工程，共改造间隔1个；新建架空线路路径长2.739km，新建杆塔19基；新建电缆线路路径长0.248km。

（二）工程建设主要内容

单位工程名称：土地整治工程。

主要内容：场地整治。

（三）工程建设有关单位

建设单位：国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司

设计单位：扬州浩辰电力设计有限公司

施工单位：扬州广源集团有限公司

监理单位：江苏兴力工程管理有限公司新兴分公司

（四）工程建设过程

1、工期

土地整治：开工日期2024年2月，完工日期2024年2月。

2、实际完成工程量

土地整治：塔基区土地整治面积 6127m²，牵张场及跨越场区土地整治 3400m²，施工道路区土地整治 1120m²，电缆施工区土地整治 2368m²。

3、工程建设中采用的主要措施及其效果、经验

工程在建设过程中各项目部认真贯彻落实公司部署，根据工程水保方案及批复文件要求，从设计、施工、监理、物资供应等各方面入手，组织参建单位进行了水保教育培训，编制了安全文明施工实施细则与绿色施工方案，水土保持监理规划、监理实施细则，在保证工程质量的同时，落实各项水保措施。该工程在水保管理、落实水土保持各项措施等方面总体良好，突出表现在以下几个方面：

- （1）水保工作制度完善、管理体系健全；
- （2）水土保持措施落实效果较好；
- （3）现场管理严，控制了施工过程中水土流失；
- （4）强化培训与宣传，提高了施工单位水保意识。

二、合同执行情况

项目建设过程中，依据法律、行政法规和规章制度，采取法律的、行政的和经济的手段，对合同关系进行组织、协调和监督。通过跟踪管理，监督施工单位履行合同各项约定；通过风险分析，预防索赔事件发生；依据合同约定，解决和处理好工程变更、违约管理等问题。确保了建设过程中无合同纠纷，合同执行情况和管理工作良好。

三、工程质量评定

（一）分部工程质量评定

本单位工程监理单位及项目法人评定为合格。

质量评定结果

单位工程	分部工程	单元工程					
		措施名称	数量	合格数	合格率	优良数	优良率
土地整治	场地整治	塔基区土地整治	1	1	100%	1	100%
		牵张场及跨越场区土地整治	1	1	100%	1	100%
		施工道路区土地整治	1	1	100%	1	100%
		电缆施工区土地整治	1	1	100%	1	100%

（二）成果分析

该施工单位的水土保持设施能满足水土流失防治要求，水土流失得到了

有效的控制，使水土流失面积逐步减少，水土流失量逐渐降低。

（三）外观评价

土地整治平整度、地表处理等符合设计要求。各项单位工程外观质量达到《水土保持施工质量评定规程》的标准要求。

（四）质量监督单位的工程质量等级核定意见

合格。

四、存在的主要问题及处理意见

无。

五、验收结论及对工程管理的建议

在本工程建设期间，主体工程中具有水土保持功能的措施实施后起到了积极的水土流失防治作用；新增的水土保持措施也随主体工程施工同步实施，防治工程建设可能产生的水土流失。水土流失防治责任范围内得到了及时有效的治理，本工程建设区的水土保持工程标准较高，质量合格，工程实施进度符合合同预期目标，投资达到设计概算要求，资料完善齐备，工程水土流失防治责任范围的水土流失得到了较为有效的治理，项目区的生态环境较工程施工期有所改善，总体上发挥了保持水土、改善生态环境的作用。




综上所述，江苏智纬电子科技有限公司 110 千伏接入工程水土保持工程建设符合国家水土保持法律法规及技术规范的有关规定和要求，水土保持工程总体工程质量合格，达到了水土保持方案的要求，可以申请进行验收。

工程管理及运行管护提出建议：为了确保工程长期有效的发挥水土保持功能，建议运行单位加强运行期各项水保工程措施维护和植物措施管护工程。

六、验收组成员及参验单位代表签字表

签字页附后。

单位工程验收工作组成员签字表

姓名	单位	职务/职称	签字	备注
黄一芄	国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司	专职		建设单位
郭耀	扬州浩辰电力设计有限公司	项目负责人		设计单位
方学明	扬州广源集团有限公司	项目经理		施工单位
余仁敏	江苏兴力工程管理有限公司 新兴分公司	总监理工程师		监理单位

生产建设项目水土保持设施

单位工程验收鉴定书

生产建设项目名称：江苏智纬电子科技有限公司 110 千伏接入工程

单位工程名称：植被建设工程

所含分部工程名称：点片状植被

2024 年 6 月

生产建设项目水土保持设施

单位工程验收鉴定书

项目名称：江苏智纬电子科技有限公司 110 千伏接入工程

单位工程：植被建设工程

建设单位：国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司

设计单位：扬州浩辰电力设计有限公司

施工单位：扬州广源集团有限公司

监理单位：江苏兴大工程管理有限公司新兴分公司

验收日期：2024 年 6 月

验收地点：江苏省

前言

根据《生产建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490-2016）以及《水土保持质量评定规程》（SL336-2006）等相关水土保持工程建设法律法规，2024年6月，国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司组织，在江苏省扬州市对江苏智纬电子科技有限公司110千伏接入工程水土保持单位工程进行了自查初验。参加单位还有设计单位扬州浩辰电力设计有限公司、施工单位扬州广源集团有限公司、监理单位江苏兴力工程管理有限公司新兴分公司等。验收组成员通过查看工程现场、查阅施工文字资料、影像资料，听取设计单位、施工单位、监理单位的情况汇报后，进行了讨论，并形成验收意见，一致通过验收，并填写签发了《单位工程验收鉴定书》：

一、工程概况

（一）工程位置（部位）及任务

1、工程位置

本工程位于扬州市高邮市高邮城南经济新区（车逻镇）。

2、建设任务

本工程分为点型工程和线型工程，共改造间隔1个；新建架空线路路径长2.739km，新建杆塔19基；新建电缆线路路径长0.248km。

（二）工程建设主要内容

单位工程名称：植被建设工程。

主要内容：点片状植被。

（三）工程建设有关单位

建设单位：国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司

设计单位：扬州浩辰电力设计有限公司

施工单位：扬州广源集团有限公司

监理单位：江苏兴力工程管理有限公司新兴分公司

（四）工程建设过程

1、工期

撒播草籽：开工日期2024年3月，完工日期2024年3月。

2、实际完成工程量

撒播草籽：塔基区撒播草籽 5121 平方米；牵张场及跨越场区撒播草籽 3400 平方米；施工道路区撒播草籽 890 平方米；电缆施工区撒播草籽 1271 平方米。

3、工程建设中采用的主要措施及其效果、经验

工程在建设过程中各项目部认真贯彻落实公司部署，根据工程水保方案及批复文件要求，从设计、施工、监理、物资供应等各方面入手，组织参建单位进行了水保教育培训，编制了安全文明施工实施细则与绿色施工方案，水土保持监理规划、监理实施细则，在保证工程质量的同时，落实各项水保措施。该工程在水保管理、落实水土保持各项措施等方面总体良好，突出表现在以下几个方面：

- （1）水保工作制度完善、管理体系健全；
- （2）水土保持措施落实效果较好；
- （3）现场管理严，控制了施工过程水土流失；
- （4）强化培训与宣传，提高了施工单位水保意识。

二、合同执行情况

项目建设过程中，依据法律、行政法规和规章制度，采取法律的、行政的和经济的手段，对合同关系进行组织、协调和监督。通过跟踪管理，监督施工单位履行合同各项约定；通过风险分析，预防索赔事件发生；依据合同约定，解决和处理好工程变更、违约管理等问题。确保了建设过程中无合同纠纷，合同执行情况和管理工作良好。

三、工程质量评定

（一）分部工程质量评定

本单位工程监理单位及项目法人评定为合格。

质量评定结果

单 位 工程	分部 工程	单元工程					
		措施名称	数量	合格数	合格率	优良数	优良率
植被 建设 工程	点片 状植 被	塔基区撒播草籽	1	1	100%	1	100%
		牵张场及跨越场区撒播草籽	1	1	100%	1	100%
		施工道路区撒播草籽	1	1	100%	1	100%
		电缆施工区撒播草籽	1	1	100%	1	100%

（二）成果分析

该施工单位的水土保持设施能满足水土流失防治要求，水土流失得到了

有效的控制，使水土流失面积逐步减少，水土流失量逐渐降低。

（三）外观评价

目前植被生长存活率较高，达到 98%以上。各项单位工程外观质量达到《水土保持施工质量评定规程》的标准要求。

（四）质量监督单位的工程质量等级核定意见

合格。

四、存在的主要问题及处理意见

无。

五、验收结论及对工程管理的建议

在本工程建设期间，主体工程中具有水土保持功能的措施实施后起到了积极的水土流失防治作用；新增的水土保持措施也随主体工程施工同步实施，防治工程建设可能产生的水土流失。水土流失防治责任范围内得到了及时有效的治理，本工程建设区的水土保持工程标准较高，质量合格，工程实施进度符合合同预期目标，投资达到设计概算要求，资料完善齐备，工程水土流失防治责任范围的水土流失得到了较为有效的治理，项目区的生态环境较工程施工期有所改善，总体上发挥了保持水土、改善生态环境的作用。



综上所述，江苏智纬电子科技有限公司 110 千伏接入工程水土保持工程建设符合国家水土保持法律法规及技术规范的有关规定和要求，水土保持工程总体工程质量合格，达到了水土保持方案的要求，可以申请进行验收。

工程管理及运行管护提出建议：为了确保工程长期有效的发挥水土保持功能，建议运行单位加强运行期各项水保工程措施维护和植物措施管护工程。

六、验收组成员及参验单位代表签字表

签字页附后。

单位工程验收工作组成员签字表

姓名	单位	职务/职称	签字	备注
黄一芑	国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司	专职		建设单位
郭耀	扬州浩辰电力设计有限公司	项目负责人		设计单位
方学明	扬州广源集团有限公司	项目经理		施工单位
余仁敏	江苏兴力工程管理有限公司 新兴分公司	总监理工程师		监理单位

生产建设项目水土保持设施

分部工程验收签证

生产建设项目名称：江苏智纬电子科技有限公司 110 千伏接入工程

单位工程名称：土地整治工程

分部工程名称：土地整治

施工单位：扬州广宇集团有限公司



2024 年 6 月

一、开完日期

土地整治：开工日期 2024 年 2 月，完工日期 2024 年 2 月。

二、主要工程量

土地整治：塔基区土地整治面积 6127m²，牵张场及跨越场区土地整治 3400m²，施工道路区土地整治 1120m²，电缆施工区土地整治 2368m²。

三、工作内容及施工经过

土地整治：主体工程施工结束后，对后期复耕及绿化区域，进行清理、平整后，将剥离的表土进行回覆到原剥离处，并达到可复耕和可种植植被的条件即可。

四、质量事故及缺陷处理

施工中未发生任何质量事故，任何质量缺陷。

五、主要工程质量指标

主要用于人为扰动后的土地，整治后的立地条件应具备绿化、耕种需要，采取人工施肥、畜力耕翻地和机械耕翻地等土壤改良措施。

六、质量评定

本分部工程共有单元工程 4 个，合格单元工程 4 个，单元工程合格率 100%。

七、存在的主要问题及处理意见

无。

八、验收结论及对工程管理的建议

合格。

分部工程验收工作组成员签字表

姓名	单位	职务/职称	签字	备注
黄一芄	国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司	专职	黄一芄	建设单位
郭耀	扬州浩辰电力设计有限公司	项目负责人	郭耀	设计单位
方学明	扬州广源集团有限公司	项目经理	方学明	施工单位
余仁敏	江苏兴力工程管理有限公司 新兴分公司	总监理工程师	余仁敏	监理单位

生产建设项目水土保持设施

分部工程验收签证

生产建设项目名称：江苏智纬电子科技有限公司 110 千伏接入工程

单位工程名称：植被建设工程

分部工程名称：片状植被

施工单位：扬州广源集团有限公司



2024 年 6 月

一、开完日期

撒播草籽：开工日期 2024 年 3 月，完工日期 2024 年 3 月。

二、主要工程量

撒播草籽：塔基区撒播草籽 5121 平方米；牵张场及跨越场区撒播草籽 3400 平方米；施工道路区撒播草籽 890 平方米；电缆施工区撒播草籽 1271 平方米。

三、工作内容及施工经过

根据工程总工期的要求，土地整治工程完工后即时对裸露土地进行植被恢复。

四、质量事故及缺陷处理

施工中未发生任何质量事故，无任何质量缺陷。

五、主要工程质量指标

根据工程总工期的要求，土地整治工程完工后即时对裸露土地进行绿化。

六、质量评定

本分部工程共有单元工程 4 个，合格单元工程 4 个，单元工程合格率 100%。

七、存在的主要问题及处理意见

无。

八、验收结论

合格。

分部工程验收工作组成员签字表

姓名	单位	职务/职称	签字	备注
黄一芄	国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司	专职	黄一芄	建设单位
郭耀	扬州浩辰电力设计有限公司	项目负责人	郭耀	设计单位
方学明	扬州广源集团有限公司	项目经理	方学明	施工单位
余仁敏	江苏兴力工程管理有限公司 新兴分公司	总监理工程师	余仁敏	监理单位

附件6、水土保持补偿费发票

中央非税收入统一票据 (电子)



票据号码: 3210004569
校验码: 8e8c58
开票日期: 2024年7月31日

开票代码: 00010224
收款人统一社会信用代码: 11321084K132202434
收款人: 高邮城南经济新区管理委员会

项目编码	项目名称	单位	数量	标准	金额 (元)	备注
30176	水土保持补偿费收入		1	11,082.00	¥11,082.00	电子税票号码: 332108240700009011
金额合计 (大写): 人民币壹万壹仟零捌拾贰元整						(小写) ¥11,082.00
项目名称: 水土保持补偿费收入-建设期收入 建设期项目-区县级审批 11082.0 合同编号:						

开票单位 (章): 国家税务总局高邮市税务局第一税务分局 (办税服务厅) 复核人:

收款人: 夏云鹏



附件 7、水土保持单位工程验收照片

	
T1 塔（2024.6）	电缆施工区（2024.6）
	
T2/T3 塔（2024.6）	T4 塔（2024.6）
	
T4 塔施工便道（2024.6）	T5 塔（2024.6）

 An aerial photograph showing a large, lattice-structured electricity pylon (T6 tower) situated in a clearing surrounded by dense green trees. The tower has multiple cross-arms supporting power lines.	 An aerial photograph of a lattice-structured electricity pylon (T7 tower) in a wooded area. A red line is drawn on the ground, indicating a proposed or existing access road leading to the base of the tower.
T6 塔（2024.6）	T7 塔施工便道（2024.6）
 An aerial photograph of a lattice-structured electricity pylon (T8 tower) located in a field with several large, rounded, manicured bushes in the foreground.	 An aerial photograph of a lattice-structured electricity pylon (T9 tower) surrounded by a dense forest of tall trees.
T8 塔（2024.6）	T9 塔（2024.6）



T10 塔 (2024.6)



T11 塔 (2024.6)



T12 塔 (2024.6)



T13 塔 (2024.6)



T14 塔 (2024.6)



T15 塔 (2024.6)



T16 塔 (2024.6)



T17 塔 (2024.6)



T18 塔 (2024.6)



T19 塔 (2024.6)

**江苏智纬电子科技有限公司 110 千伏接入工程
水土保持设施验收报告编制工作的委托函**

江苏嘉溢安全环境科技服务有限公司：

根据《中华人民共和国水土保持法》、《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365 号文）以及《江苏省生产建设项目水土保持设施验收管理办法》（苏水规〔2018〕4 号）等法律法规的规定，江苏智纬电子科技有限公司 110 千伏接入工程需开展水土保持设施验收报告编制工作。现正式委托贵公司承担该项工作，望贵公司接受委托后抓紧开展工作，确保验收报告达到相关规范要求，并协助办理相关行政审批手续。

特此函达。

国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司

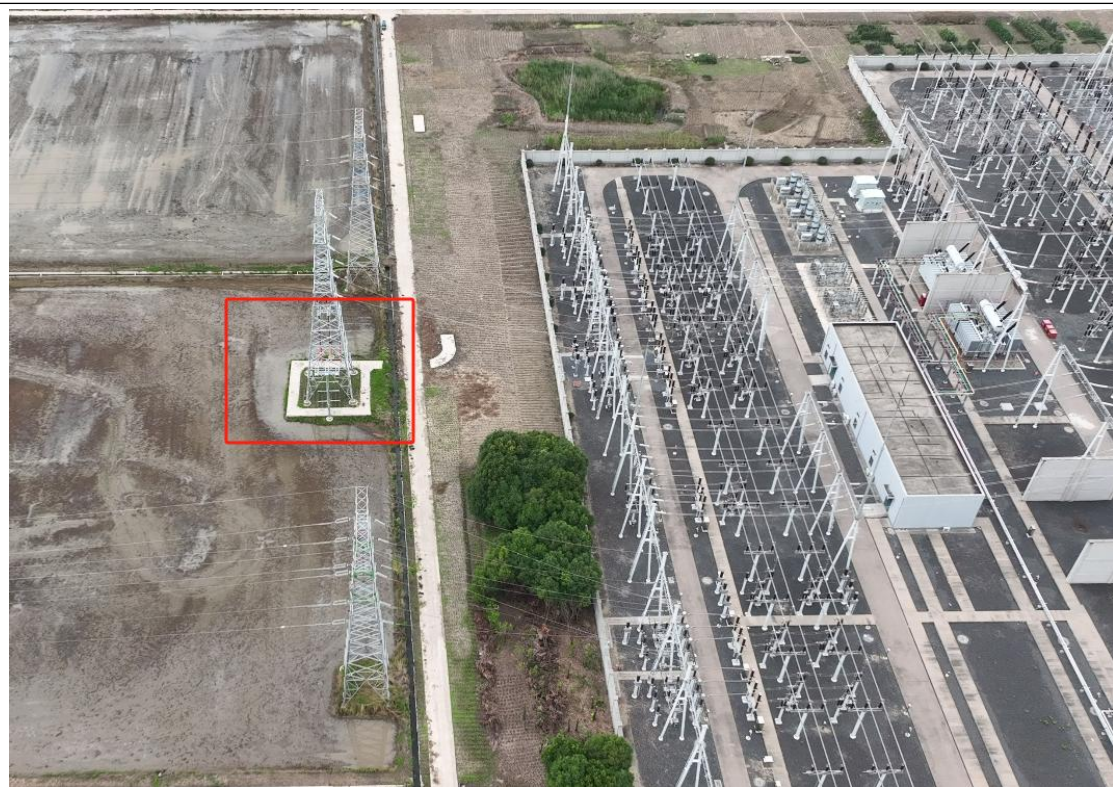
2024 年 5 月



附件 9、项目建设前后遥感影像图



T1 塔（开工前）



T1 塔（完工后）



电缆（开工前）




电缆（完工后）

附件 10、验收检查记录表

电网建设项目水土保持设施竣工
验收检查记录表

项目名称：江苏智纬电子科技有限公司 110 千伏接入工程

水土保持设施	检查标准	检查记录 (合格/基本合格/不合格)
表土剥离	符合水保方案 and 设计要求。 在施工中对剥离后的表土集中堆放，并做好苫盖防护。	合格，剥离的表土防护良好。
土地整治	符合水保方案 and 设计要求。 对扰动区域进行清理、平整、部分进行表土回覆。	合格，整治后的土地达到可进行植被恢复的要求。
点片状植被	符合水保方案 and 设计要求。 在土地整治过后的区域进行植被恢复。	合格，种植的植被覆盖度和存活率较高，均满足要求。
密目网苫盖	符合水保方案 and 设计要求。 在施工过程中对裸露地表进行苫盖。	合格，裸露地表苫盖良好，未产生严重的水土流失。
泥浆沉淀池	符合水保方案 and 设计要求。 在灌注桩基础塔内侧设置泥浆池，临时储存钻渣泥浆。	合格，泥浆池措施实施良好，减少了泥浆流失。
铺设钢板	符合水保方案 and 设计要求。 在施工过程中对裸露地表进行钢板铺设。	合格，裸露地表铺垫良好，未产生严重的水土流失。
验收组（章）： 检查人： 姜一航 朱银 日期：2024.4.26		

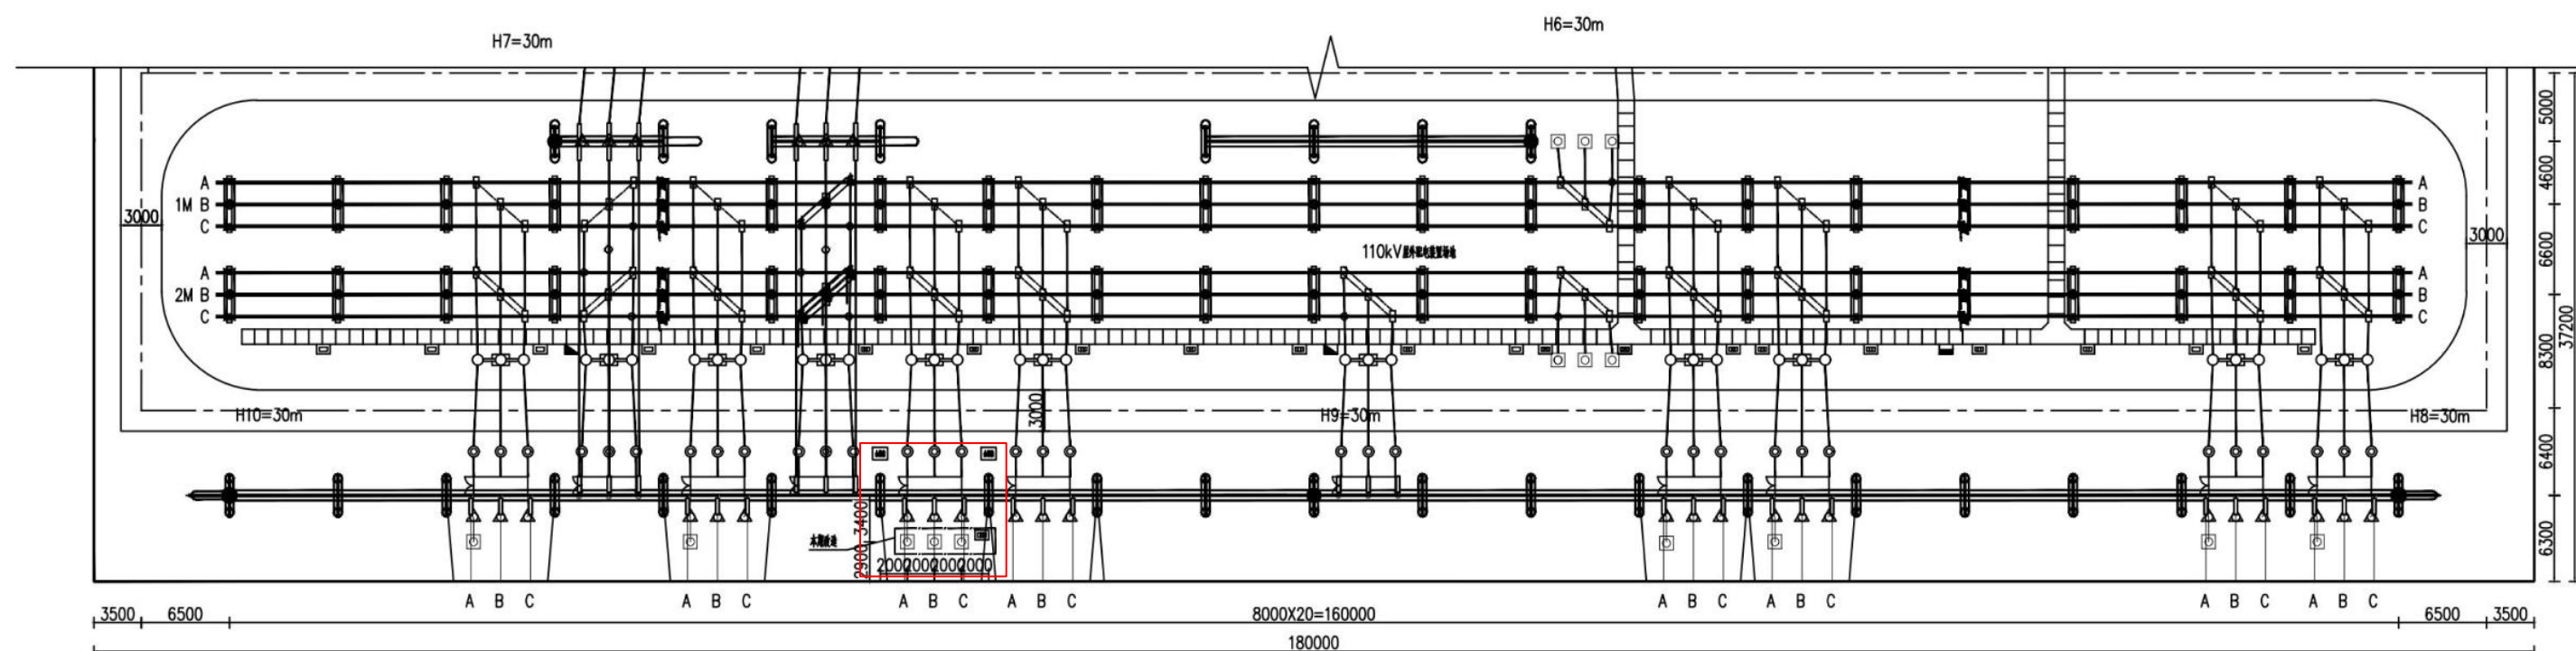


江苏智纬电子科技有限公司110千伏接入工程

图例

新建线路路径

附图1 项目地理位置图



回路名称	预留出线	预留出线	断子线7!3	#1主支	断武线7!4	#2主支	相线 (原备用7!5)	备用7!6	预留出线	预留#3主支	母线	预留#4主支	母线设备	断埋线7!8	断实线7!9	预留出线	预留出线	预留出线	断张线7!D	断杨线7!E
回路编号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

间隔改造区


附图2-1、间隔改造总平图

 扬州浩辰电力设计有限公司 设计号: A232012689	电压等级: 220kV 母线: 10kV 回路数: 1 工程: 新建		材料:
	110kV 电压等级: 110kV		材料:
	数量: 1.200	日期: 2023.06	材料: C-S20230030002-C-A02-
			材料:

图框代号：TKA20



说明：
1. 智纬科技~勤王110千伏线路工程，起点为220kV勤王变T15间隔，迄点为新建T19杆（新建T19至新建110kV智纬变电站GIS终端列在用户工程中）。
2. 新建线路总长度为2.987km(T1-T19)，其中架空段2.739km, 电缆段0.248km, 采用双回路设计。新建杆塔19基，其中双回路角钢塔9基, 双回路钢管杆10基。
3. 导线采用1×JL/G1A-400/35钢芯铝绞线，地线采用2根48芯OPGW-120复合光缆。



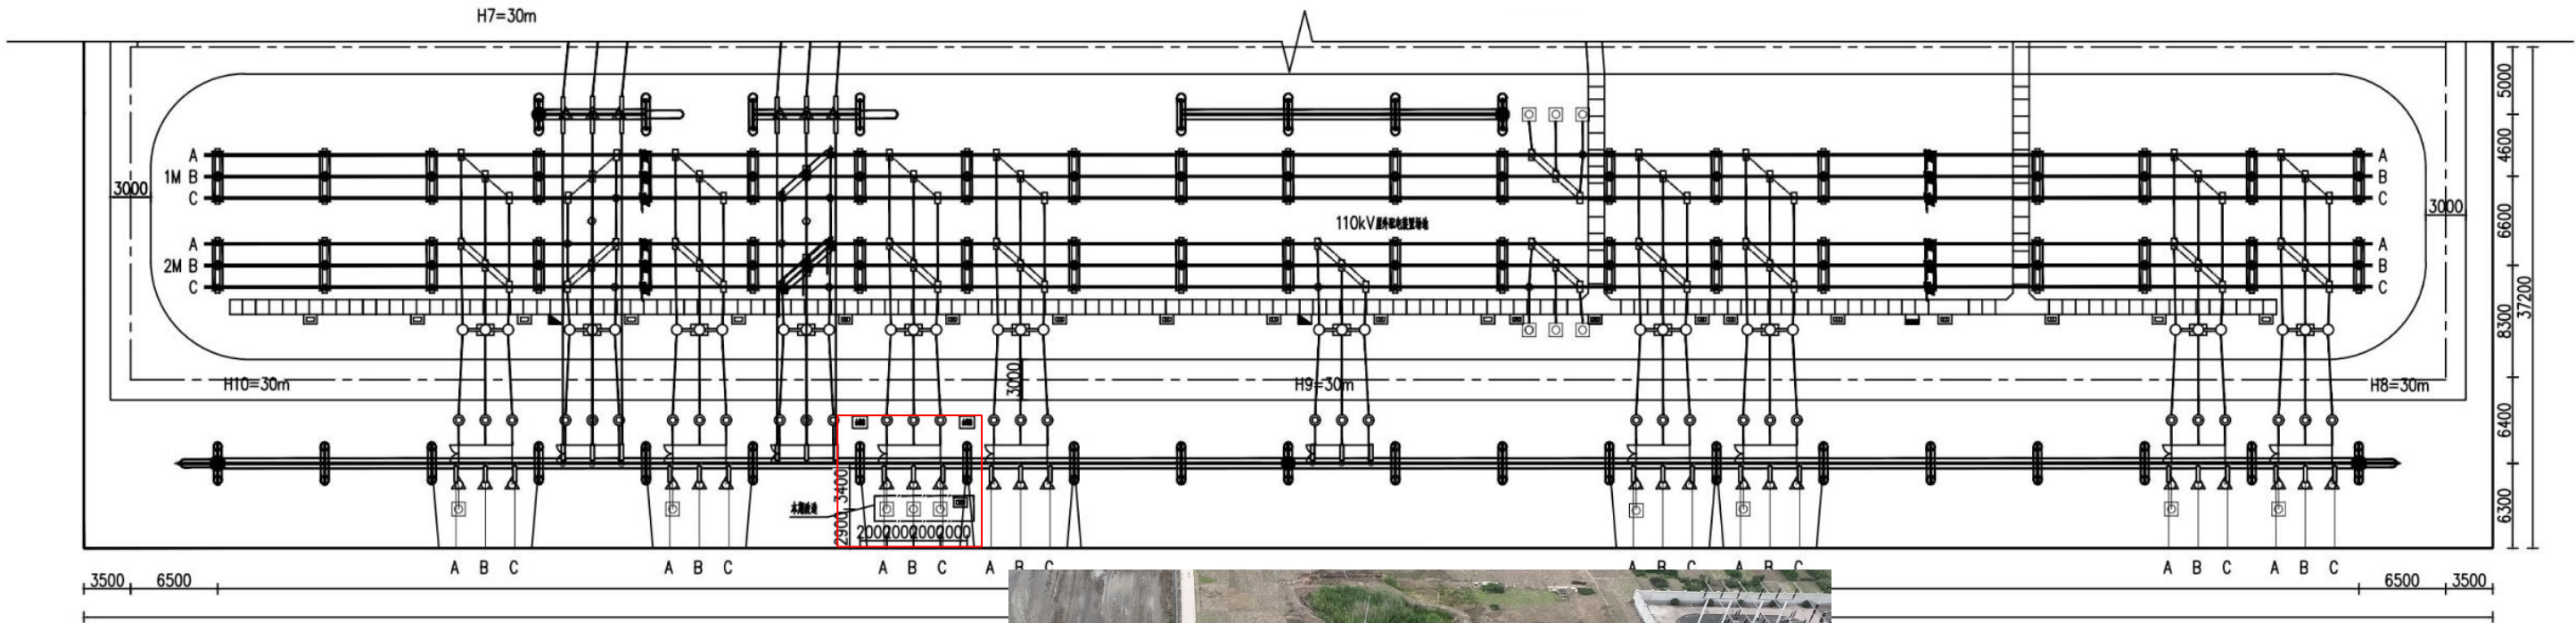
批准	设计	校核	设计
审核	设计	设计	设计
比例	日期	2024.03	

智纬科技~勤王110千伏线路工程	竣工图	设计阶段
线路路径图		
图号	HC-S20230030002-Z-A01-02	

间隔改造区防治责任范围 110m²
临时措施：密目网苫盖 80m²

密目网苫盖：在施工过程中对裸露地表及临时堆土进行苫盖，苫盖面积约 80m²。

防治分区	占地性质		占地面积
	永久占地面积	临时占地面积	
间隔改造区	110	0	110



间隔名称	间隔出线	间隔出线	量子线7!3	#1主变	量子线7!4	#2主变	量子线 (原备用7!5)	备
间隔编号	1	2	3	4	5	6	7	



间隔出线	间隔出线	间隔出线	量子线7!D	量子线7!E
16	17	18	19	20

图例
□ 间隔改造区

江苏嘉溢安全环境科技服务有限公司			
核定	黄佩玉	竣工	设计
审查	梅璇	水土保持	部分
校核	张剑明	江苏智纬电子科技有限公司 110 千伏接入工程	
设计	陈昊		
制图		间隔扩建工程水土流失防 治责任范围及水土保持措 施竣工验收图	
比例	1:800		
设计证号		日期	2024.07
资质证号		图号	附图 3-1



表 3.5-3 水土保持工程措施方案设计与实际实施对比情况

防治分区	措施名称	单位	方案设计	实际完成	变化情况	实施位置	实施时段
间隔改造区	密目网苫盖	m ²	80	80	0	裸露地表	2024.3
塔基区	表土剥离	m ³	705	705	0	植被良好的区域	2023.11
	土地整治	m ²	6533	6127	-406	除硬化外裸露地表	2024.2
	撒播草籽	m ²	5527	5121	-406	占用绿化带、空闲地除硬化外区域	2024.3
	泥浆沉淀池	座	19	19	0	灌注桩基础旁	2024.11
	密目网苫盖	m ²	4000	3500	-500	裸露地表及临时堆土区域	2024.11-2024.12
	土质排水沟	m	1220	0	-1220	/	/
	土质沉沙池	座	19	0	-19	/	/
牵张场及跨越场区	土地整治	m ²	3400	3400	0	全区	2024.2
	撒播草籽	m ²	3400	3400	0	占用绿化带、空闲地区域	2024.3
	铺设钢板	m ²	1000	1000	0	松软路面区域	2023.12-2024.1
	彩条布铺垫	m ²	2000	2000	0	裸露地表	2023.12-2024.1
施工道路区	土地整治	m ²	1120	1120	0	全区	2024.2
	撒播草籽	m ²	890	890	0	占用绿化带、空闲地区域	2024.3
电缆施工区	铺设钢板	m ²	850	850	0	机器占压区域	2023.11-2023.12
	表土剥离	m ³	110	110	0	植被良好的区域	2023.10
	土地整治	m ²	2368	2368	0	除硬化外裸露地表	2024.2
	撒播草籽	m ²	1271	1271	0	占用绿化带、空闲地区域	2024.3
	密目网苫盖	m ²	1600	1600	0	裸露地表	2024.1
	土质排水沟	m	240	0	-240	/	/
	土质沉沙池	座	2	0	-2	/	/

表 1.1-2 工程征占地统计表 (单位: m²)

项目组成	占地面积			占地类型				水土流失防治责任范围
	永久占地	临时占地	小计	公共管理与公共服务用地	耕地	交通运输用地	其他土地	
间隔扩建区	110	0	110	110	0	0	0	110
塔基区	886	5321	6207	0	1026	3847	1334	6207
牵张场基跨越场区	0	3400	3400	0	0	2800	600	3400
施工道路区	0	1120	1120	0	230	640	250	1120
电缆施工区	160	2450	2610	0	1117	82	1411	2610
合计	1156	12291	13447	110	2373	7369	3595	13447

江苏嘉溢安全环境科技服务有限公司

批准	周	江苏智纬电子科技有限公司110千伏接入工程	验收阶段			
核定	黄		水土保持			
审查	梅	水土流失防治责任范围及水土保持措施竣工验收图				
校核	张					
设计	陈					
制图	陈					
设计证号		比例	1:100	日期	2024.6	
资质证号		/			图号	附图3-2
