

2025—TKST
0092

江苏镇江华润镇江经开区三桥渔光互补光伏发电项  
目 110 千伏送出工程

# 水土保持方案报告表

建设单位：国网江苏省电力有限公司镇江供电分公司

编制单位：江苏通凯生态科技有限公司

2025 年 11 月

2025—TKST
0092

江苏镇江华润镇江经开区三桥渔光互补光伏发电项  
目 110 千伏送出工程

# 水土保持方案报告表

建设单位：国网江苏省电力有限公司镇江供电公司  
编制单位：江苏通凯生态科技有限公司

2025 年 11 月





## 生产建设项目水土保持方案编制单位水平评价证书 (正本)

单位名称：江苏通凯生态科技有限公司

法定代表人：徐玉奎

单位等级：★★★ (3星)

证书编号：水保方案(苏)字第 20230013 号

有效期至：自 2023 年 10 月 01 日至 2026 年 09 月 30 日

发证机构：中国水土保持学会

发证时间：2024 年 6 月 5 日

仅限于  
江苏镇江润州区三桥渔光互补光伏发电项目 110 千伏送出工  
程水土保持方案报告表



编制单位：江苏通凯生态科技有限公司

地 址：南京市江宁区秣陵街道利源南路 55 号 C9 栋 3 楼

邮 编：211102

联 系 人：余志宏

电 话：


电子邮箱：

# 江苏镇江华润镇江经开区三桥渔光互补光伏发电项 目 110 千伏送出工程水土保持方案报告表

## 责任页

(江苏通凯生态科技有限公司)

批准：徐玉奎（总经理）



核定：林炬（高级工程师）




审查：余志宏（高级工程师）




校核：何琪（工程师）




项目负责人：于海鹏（工程师）



编写：姜启帆（工程师）（参编章节：第 1、3 章、附件）



于海鹏（工程师）（参编章节：第 2 章、附图）



## 目 录

江苏镇江华润镇江经开区三桥渔光互补光伏发电项目 110 千伏送出工程水土保持方案报告表 .....	1
方案报告表补充说明 .....	3
<b>1 项目简况 .....</b>	<b>3</b>
<b>1.1 项目概况.....</b>	<b>3</b>
1.1.1 项目基本情况 .....	3
1.1.2 项目组成情况 .....	4
1.1.3 工程布置情况 .....	5
1.1.4 工程占地情况 .....	11
1.1.5 土石方平衡情况 .....	9
1.1.6 项目施工进度情况 .....	17
<b>1.2 项目区概况.....</b>	<b>11</b>
1.2.1 地形地貌 .....	11
1.2.2 地质地震 .....	11
1.2.3 水系情况 .....	11
1.2.4 气候特征 .....	11
1.2.5 土壤和植被 .....	11
<b>1.3 水土保持分析与评价.....</b>	<b>13</b>
<b>1.4 水土流失防治目标及防治责任范围.....</b>	<b>13</b>
1.4.1 设计水平年 .....	20
1.4.2 防治目标 .....	14
1.4.3 防治责任范围 .....	15
<b>2 水土流失预测与水土保持措施布设 .....</b>	<b>16</b>
<b>2.1 水土流失预测.....</b>	<b>16</b>
2.1.1 预测单元 .....	16
2.1.2 预测时段 .....	16
2.1.3 土壤侵蚀模数 .....	16
2.1.4 预测结果 .....	18
2.1.5 水土流失危害分析 .....	19
<b>2.2 水土保持措施布设.....</b>	<b>19</b>

2.2.1 水土保持措施总体布局 .....	19
2.2.2 分区措施布设 .....	20
2.2.3 水土保持措施工程量汇总 .....	20
2.2.4 防治措施进度安排 .....	30
<b>3 水土保持投资估算及效益分析 .....</b>	<b>23</b>
<b>3.1 投资估算成果.....</b>	<b>23</b>
<b>3.2 效益分析.....</b>	<b>23</b>
3.2.1 水土流失治理度 .....	25
3.2.2 土壤流失控制比 .....	25
3.2.3 渣土防护率 .....	25
3.2.4 表土保护率 .....	25
3.2.5 林草植被恢复率 .....	25
3.2.6 林草覆盖率 .....	25
3.2.7 六项指标达标情况 .....	26
<b>3.3 水土保持管理.....</b>	<b>27</b>
3.3.1 组织管理 .....	27
3.3.2 后续设计 .....	28
3.3.3 水土保持监测和监理 .....	28
3.3.4 水土保持施工 .....	28
3.3.5 水土保持设施验收 .....	28

## 附件

- 附件 1 委托书
- 附件 2 核准批复
- 附件 3 可研批复
- 附件 4 规划文件
- 附件 5 占地情况说明函

## 附图

- 附图 1 项目地理位置图
- 附图 2 项目区水系图
- 附图 3 江苏省省级水土流失重点预防区和重点治理区图

附图 4 土壤侵蚀分布图

附图 5 项目总体布置图

附图 6 分区防治措施总体布局图

附图 7 电缆施工典型布置图

附图 8 土质排水沟、沉沙池典型设计图

## 江苏镇江华润镇江经开区三桥渔光互补光伏发电项目 110 千伏送出工程水土保持方案报告表

项目概况	位置	项目位于江苏省镇江市京口区姚桥镇。华润光伏升压站~220 千伏姚桥变 110 千伏线路工程(电缆)起于华润光伏升压站( )，终于 220kV 姚桥变( )。				
	建设内容	<p>本项目分点型工程和线型工程，共改造间隔 1 个(不涉及土建)，新建电缆线路路径长 0.197km，其中新建电缆通道长 0.162km，利用已有电缆通道敷设电缆 0.035km。具体包括：</p> <p>(1) 点型工程</p> <p>220kV 姚桥变 110kV 间隔改造工程：新增两端光纤分相电流差动保护柜 1 面。新增电能质量在线监测装置 1 套。更换 0.2S 级关口校核电能表 1 只(不涉及土建)。</p> <p>(2) 线型工程</p> <p>华润光伏升压站~220 千伏姚桥变 110 千伏线路工程(电缆)：本项目新建 110kV 单回电缆线路 1×0.197km，其中新建电缆通道 0.162km(新建电缆排管 30m、电缆拉管 88m、电缆沟 8m、直线井 1 座、三通井 1 座、余缆井 1 座)，利用既有电缆沟敷设电缆 0.035km。</p>				
	建设性质	新建输变电工程		总投资(万元)		
	土建投资(万元)			占地面积(m <sup>2</sup> )		永久：107
						临时：2148
						总占地：2255
	动工时间	2026 年 7 月		完工时间	2026 年 9 月	
	土石方(m <sup>3</sup> )	挖填方总量	挖方	填方	借方	余(弃)方
		1384	692	692	0	0
	取土(石、砂)场	/				
弃土(石、砂)场	/					
项目区概况	涉及重点防治区情况	江苏省省级水土流失重点预防区		地貌类型	平原	
	原地貌土壤侵蚀模数[t/km <sup>2</sup> ·a]	160		容许土壤流失量[t/km <sup>2</sup> ·a]	500	
项目选址(线)水土保持评价	项目选址(线)不涉及国家级水土流失重点治理区和重点预防区，不涉及河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带，不涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站，但无法避让江苏省省级水土流失重点预防区，水土流失防治标准执行南方红壤区一级标准。施工期优化施工工艺；严格控制占地面积；加强表土资源保护；设置泥浆沉淀池，避免泥浆外排，设置苫盖、排水、沉沙等措施来减少水土流失。因此项目无重大水土保持制约因素。					
预测水土流失总量(t)	3.06					
防治责任范围(m <sup>2</sup> )	2255					
防治标准等级及目标	防治标准等级	南方红壤区一级标准				
	水土流失治理度(%)	98	土壤流失控制比		1.0	
	渣土防护率(%)	97	表土保护率(%)		92	
	林草植被恢复率(%)	98	林草覆盖率(%)		27	

	防治分区	工程措施	植物措施	临时措施
水土保持措施	电缆施工区	表土剥离 319m <sup>3</sup> 土地整治 1668m <sup>2</sup>	撒播草籽 1668m <sup>2</sup>	泥浆沉淀池 1 座 防尘网苫盖 1200m <sup>2</sup> 土质排水沟 134m 土质沉沙池 2 座
	施工临时道路区	土地整治 480m <sup>2</sup>	撒播草籽 480m <sup>2</sup>	铺设钢板 400m <sup>2</sup>
	工程措施	1.08	植物措施	0.35
水土保持投资估算 (万元)	临时措施	4.37	水土保持补偿费	0.2706
	独立费用	建设管理费		3.17
		水土保持监理费		0.13
		科研勘测设计费		3.74
	总投资	14.39		
编制单位	江苏通凯生态科技有限公司	建设单位	国网江苏省电力有限公司镇江供电公司	
法人代表及电话	徐玉奎 /	法人代表及电话	郑建华 /	
地址	南京市江宁区秣陵街道利源南路 55 号 C9 栋 3 楼	地址	镇江市电力路 182 号	
邮编	211102	邮编	212001	
联系人及电话	余志宏	联系人及电话	李若冰	
电子信箱		电子信箱		
传真	/	传真	/	

# 方案报告表补充说明

## 1 项目简况

### 1.1 项目概况

#### 1.1.1 项目基本情况

建设地点：项目位于江苏省镇江市京口区姚桥镇。华润光伏升压站~220 千伏姚桥变 110 千伏线路工程（电缆）起于华润光伏升压站（ . . . ， . . . ，终于 220kV 姚桥变（ . . . ， . . . ”）。

建设必要性：光伏电站的建设可发挥减排效益，减少温室气体的排放，镇江地区属于我国光照资源丰富区，开发利用前景较为广阔，三桥渔光互补项目利用太阳能光伏发电创造了较好的经济效益和社会效益，但所发电力需在镇江电网消纳，因此为了优化江苏省镇江市京口区 110 千伏网架结构，增强供电可靠性，国网江苏省电力有限公司镇江供电分公司建设江苏镇江华润镇江经开区三桥渔光互补光伏发电项目 110 千伏送出工程十分必要。

前期工作：（1）2025 年 4 月 18 日，镇江市自然资源和规划局经济技术开发区分局以《关于对江苏华润镇江经开区三桥渔光互补光伏发电项目 110 千伏送出工程路径方案复函》（镇自然资经开函（2025〕26 号）同意了本工程线路路径。

（2）2025 年 7 月 9 日，国网江苏省电力有限公司镇江供电分公司以《国网江苏省电力有限公司镇江供电分公司关于江苏镇江华润镇江经开区三桥渔光互补光伏发电项目 110 千伏送出工程可行性研究的意见》（镇供电发展（2025〕172 号）对本工程可研进行了批复。

（3）2025 年 8 月 14 日，江苏省发展和改革委员会以《省发展改革委关于盐城鹤栖~京奕 220 千伏线路工程等电网项目核准的批复》（苏发改能源发〔2025〕838 号）对本工程核准进行了批复。

工程规模：本项目分点型工程和线型工程，共改造间隔 1 个（不涉及土建），新建电缆线路路径长 0.197km，其中新建电缆通道长 0.162km，利用已有电缆通道敷设电缆 0.035km。具体包括：

#### （1）点型工程

220kV 姚桥变 110kV 间隔改造工程：新增两端光纤分相电流差动保护柜 1

面。新增电能质量在线监测装置 1 套。更换 0.2S 级关口校核电能表 1 只（不涉及土建）。

### （2）线型工程

华润光伏升压站~220 千伏姚桥变 110 千伏线路工程（电缆）：本项目新建 110kV 单回电缆线路  $1 \times 0.197\text{km}$ ，其中新建电缆通道 0.162km（新建电缆排管 30m、电缆拉管 88m、电缆沟 8m、直线井 1 座、三通井 1 座、余缆井 1 座），利用既有电缆沟敷设电缆 0.035km。

工程占地：工程总占地  $2255\text{m}^2$ ，其中永久占地  $107\text{m}^2$ ，临时占地  $2148\text{m}^2$ ；占地类型为其他土地。

工程挖填方：工程挖填方总量  $1384\text{m}^3$ ，其中挖方总量  $692\text{m}^3$ （含表土剥离  $319\text{m}^3$ ），回填总量  $692\text{m}^3$ （含表土回覆  $319\text{m}^3$ ），无余方，无借方。

工期安排：工程计划于 2026 年 7 月开工，2026 年 9 月完工，总工期 3 个月。

工程投资：工程总投资 万元，其中土建投资约 万元。

### 1.1.2 项目组成情况

本工程由国网江苏省电力有限公司镇江供电分公司统一建设。经济技术指标见表 1.1-1。

表 1.1-1 项目主要经济技术指标表

一、基本概况			
项目名称	江苏镇江华润镇江经开区三桥渔光互补光伏发电项目 110 千伏送出工程	工程性质	新建输变电工程
建设单位	国网江苏省电力有限公司镇江供电分公司	建设期	2026.07-2026.09
建设地点	江苏省镇江市京口区姚桥镇	总投资	元
电压等级	110kV	土建投资	元
工程规模	<p>本项目分点型工程和线型工程，共改造间隔 1 个（不涉及土建），新建电缆线路路径长 0.197km，其中新建电缆通道长 0.162km，利用已有电缆通道敷设电缆 0.035km。具体包括：</p> <p>（1）点型工程</p> <p>220kV 姚桥变 110kV 间隔改造工程：新增两端光纤分相电流差动保护柜 1 面。新增电能质量在线监测装置 1 套。更换 0.2S 级关口校核电能表 1 只（不涉及土建）。</p> <p>（2）线型工程</p> <p>华润光伏升压站~220 千伏姚桥变 110 千伏线路工程（电缆）：本项目新建 110kV 单回电缆线路 <math>1 \times 0.197\text{km}</math>，其中新建电缆通道 0.162km（新建电缆排管 30m、电缆拉管 88m、电缆沟 8m、直线井 1 座、三通井 1 座、余缆井 1 座），利用既有电缆沟敷设电缆 0.035km。</p>		
二、电缆经济技术指标			
电压等级	110kV		

新建电缆线路长度	162m
电缆型号	ZC-YJLW03-Z-64/110kV-1×800mm <sup>2</sup>
电缆敷设方式	排管、拉管、电缆沟井

### 1.1.3 工程布置情况

#### (1) 平面布置

新建 110kV 单回电缆线路起自华润光伏升压站西北侧电缆终端立柱，向西北穿越姚桥变 10kV 出线管沟、110kV 姚路线后转向西南至姚桥变北侧既有电缆沟，再向东南至姚桥变 110kV GIS 室。

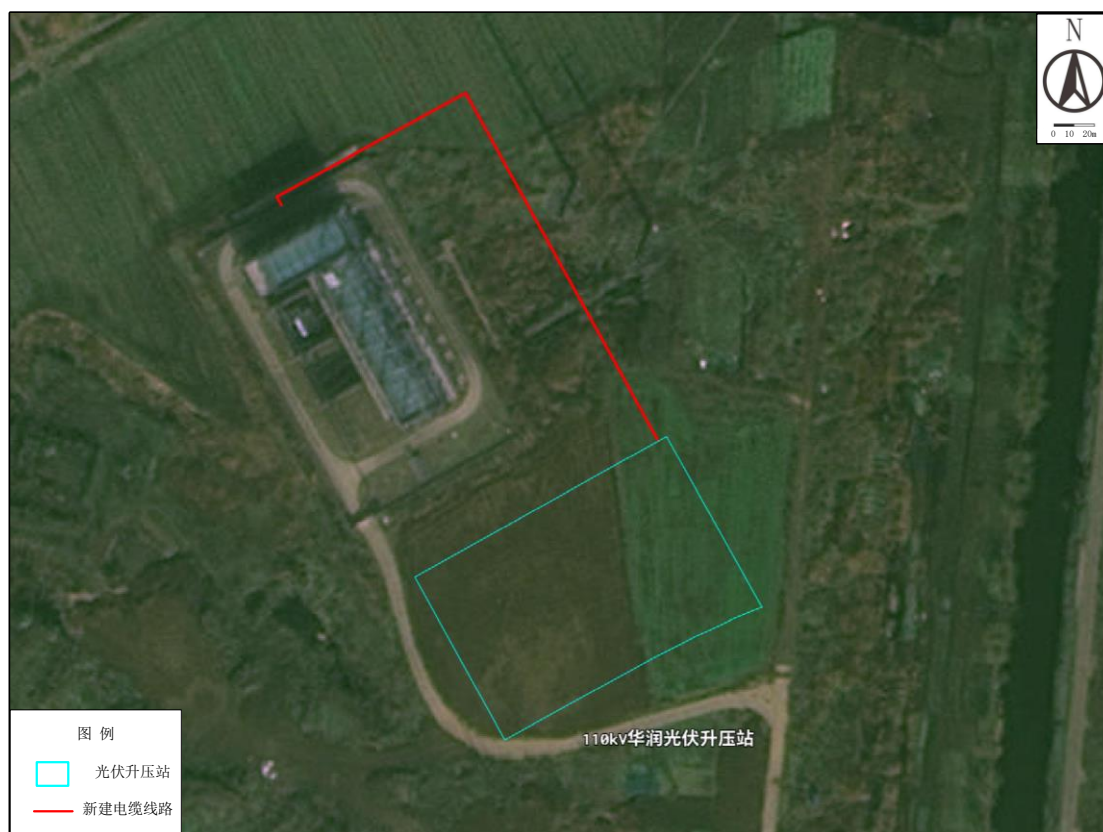


图 1.1-1 线路路径走向图

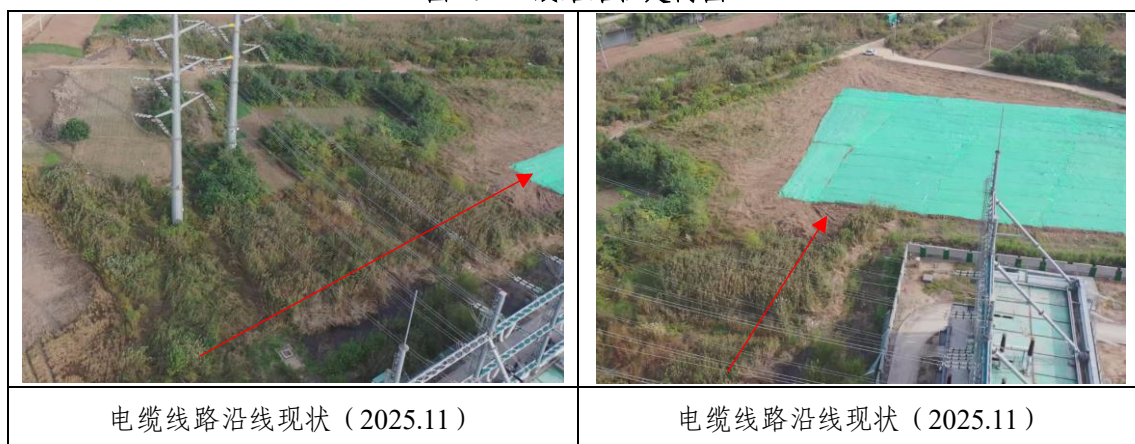


图 1.1-2 本工程线路沿线现状照片

## (2) 竖向设计

本线路沿线所属地貌区属于宁镇扬丘陵岗地~平原区,场地地貌类型为沉积平原,沿线地形较为平坦,线路路径沿线地面标高为 5.10~5.65m (1985 国家高程基准),沿线以其他土地为主,交通条件便利。

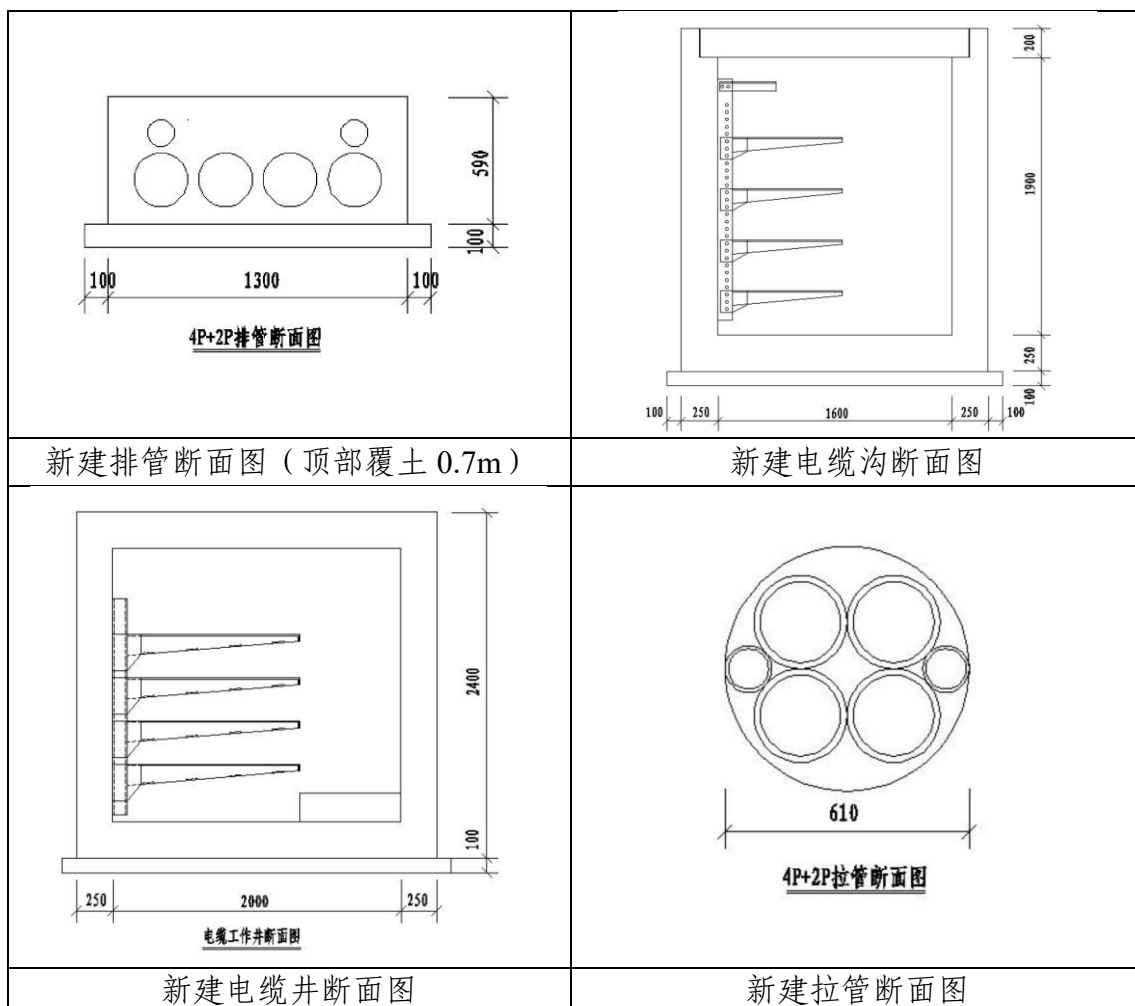


图 1.1-3 新建电缆断面图

表 1.1-2 本工程电缆竖向设计一览表

类型		长度 (m)	开挖宽度 (m)	深度 (m)
电缆井	直线井	8	2.7	2.5
	三通井	8	2.7	2.5
	余缆井	20	2.7	2.5
电缆沟		8	2.3	2.45
排管		30	1.5	1.39
拉管		88	管径 0.61m	
合计		162	/	

## (3) 施工组织

### ① 施工用水、排水、用电、通信系统

用水:本工程线路供水水源采用接取附近市政自来水或附近河流抽水取水方案。

排水:本工程施工临时排水通过排水沟收集,至沉沙池沉淀后排入临近的排水沟中。本方案通过分析地形地貌确定排水方向,调查土壤类型和地下水情况,了解土壤透水性能,确定排水深度,同时调查分析施工现场周边环境情况,确定不会对周边环境造成影响。

用电:本工程施工过程中用电根据周边设施情况安排,周围已有用电用户区,可按照安全用电规定引接用于施工用电,无用电用户区可采用自备小型柴油发电机提供施工电源

通信:本工程施工场地内施工人员相对较少,可利用无线通信设备进行联络。

#### ②施工生产生活区

本工程不设置固定的施工生活区,采取租用附近民房的方式,施工生产区布设在各区域的临时占地中。

#### ③临时堆土

本工程电缆施工开挖的土方临时堆放在电缆通道两侧,并采取防尘网进行苫盖,施工后期全部回填并压实平整。表土在区域内单独设置堆土场地与其他土方分开。临时堆土边坡比不大于 1:1.0,堆土高度不超过 2.5m。

#### ④施工道路

本工程线路施工对外交通主要解决建筑材料和设备等运输问题,可以利用沿线附近的县道、乡道、村道通行。现有交通条件能基本满足建筑材料和设备运输要求,根据现场勘查,本工程需新开辟临时道路约 120m,临时道路位于姚桥变东侧,道路宽度约 4m,总占地面积约 480m<sup>2</sup>。

#### ⑤穿越道路情况

本工程沿线需穿越姚桥变 10kV 出线管沟、110kV 姚路线,根据设计资料,本项目穿越管沟均采用拉管穿钻越形式。

### (4) 施工工艺

采用机械和人工相结合的方式开挖沟槽,施工顺序为:测量定线→清除障碍物→平整工作带→管沟开挖→钢管运输、布管→组装焊接→下沟→回填→竣工验收。开挖前先剥离表层土,临时堆土表面采用防尘网进行苫盖。土方回填时按照后挖先填、先挖后填的原则进行施工。

拉管管片采用钢筋混凝土，拉管内置电缆保护管，管材材质采用 MPP 管。拉管段电缆采用三角排列。施工前，应查明管道拟穿越地段的建筑基础，地下障碍物及各类地下管线的性质类型及空间位置，必要时请相关管线监护人员现场监护。拉管出土角度不应大于 20°，拉管轨迹的转弯半径应大于 150m。拉管与地下管线平行敷设时，扩孔与既有管线垂直净距不得小于 1.5 倍扩孔直径；拉管与既有管线交叉时，拉管与既有管线的垂直净距应大于 1 倍扩孔直径且不小于 0.5m。回拖管道过程中应避免发生扭转，拉管内应预留绳索且两端做好标记一一对应，以便电缆敷设；拉管施工完成后，必须在回扩孔内压密注浆以防塌陷；暂时不使用的管道应及时封堵。

#### 1.1.4 工程占地情况

工程总占地面积约为 2255m<sup>2</sup>，其中永久占地为 107m<sup>2</sup>，其中全部为电缆施工区永久占地；临时占地为 2148m<sup>2</sup>，含电缆施工区临时占地 1668m<sup>2</sup>、施工临时道路区临时占地 480m<sup>2</sup>。占地类型为其他土地。

##### (1) 电缆施工区

根据现场勘察和查阅设计文件，本工程新建电缆通道土建长度 162m，电缆沟基础开挖作业宽度以一侧外扩 5.0m 用于表土及施工器械堆放、另一侧外扩 6.0m 用于基础土方堆放，总占地面积按长度×（开挖宽度+11m）计算。本项目共布设 1 段拉管，其中拉管两端各设置一处施工区域，共设置 2 处拉管施工占地，每处占地面积各 400m<sup>2</sup>。电缆施工区总占地面积 1775m<sup>2</sup>，其中永久占地 107m<sup>2</sup>，临时占地 1668m<sup>2</sup>。本工程电缆通道型式及占地面积详见表 1.1-3。

表 1.1-3 电缆施工区占地情况表

类型	长度 (m)	宽度 (m)			永久占地面积 (m <sup>2</sup> )	临时占地面积 (m <sup>2</sup> )	总占地面积 (m <sup>2</sup> )	
		开挖宽度	盖板宽度	施工范围				
电缆井	直线井	8	2.7	2.5	13.7	20	90	110
	三通井	8	2.7	2.5	13.7	20	90	110
	余缆井	20	2.7	2.5	13.7	50	224	274
电缆沟	8	2.3	2.1	13.3	17	89	106	
排管	30	1.5	/	12.5	0	375	375	
拉管	88	管径 0.61m			0	800	800	
合计	162	/			107	1668	1775	

注：排管顶上覆土，无永久占地；电缆沟、井上不覆土，永久占地计列方式为长度×盖板宽度。

##### (2) 施工临时道路区

根据现场勘察和查阅设计文件，线路沿线经过区域地形平坦，地貌为平原，本工程需新开辟的临时道路约 120m，平均宽度按 4.0m 计，施工临时道路区占地 480m<sup>2</sup>，为临时占地。

本工程各分区占地情况见表 1.1-4。

表 1.1-4 工程分区占地情况统计表

单位：m<sup>2</sup>

工程分区	占地性质		占地面积	占地类型
	永久占地	临时占地		其他土地
电缆施工区	107	1668	1775	1775
施工临时道路区	0	480	480	480
<b>合计</b>	<b>107</b>	<b>2148</b>	<b>2255</b>	<b>2255</b>

注：其他土地为空闲地。

### 1.1.5 土石方平衡情况

#### (1) 电缆施工区

电缆施工区主要位于空闲地区域，施工前期对电缆施工区的开挖及地表扰动较强区域进行表土剥离，可剥离表土厚度约 0.3m，剥离面积 1063m<sup>2</sup>，表土剥离量为 319m<sup>3</sup>。剥离的表土堆放在开挖区域一侧的临时堆土区域，临时堆土采用防尘网临时苫盖。施工结束后对电缆施工区进行土地整治，土地整治后将前期剥离表土回覆利用，表土回覆量为 319m<sup>3</sup>。

通过现场勘查和查阅设计资料，本工程新建电缆基础挖填土方情况统计见表 1.1-5。

表 1.1-5 电缆通道挖填方统计表

类型		长度 (m)	开挖宽度 (m)	深度 (m)	泥浆量 (m <sup>3</sup> )	泥浆池挖 方量 (m <sup>3</sup> )	挖方量 (m <sup>3</sup> )	填方量 (m <sup>3</sup> )
电缆 井	直线井	8	2.7	2.5	/	/	48	48
	三通井	8	2.7	2.5	/	/	48	48
	余缆井	20	2.7	2.5	/	/	119	119
电缆沟		8	2.3	2.45	/	/	40	40
排管		30	1.5	1.39	/	/	49	49
拉管		88	管径 0.61m		26	26	52	52
<b>合计</b>		<b>162</b>	/		<b>26</b>	<b>26</b>	<b>356</b>	<b>356</b>

注：电缆井、排管挖方量=长度×开挖宽度×(深度-0.30m)，拉管泥浆量=长度×π×(管径/2)<sup>2</sup>，拉管挖方量=泥浆量+泥浆池挖方量，产生土方施工后期全部回填平摊至电缆施工区范围内。

通过上表计算可得，全线电缆基础开挖产生的土方共约为 356m<sup>3</sup>。施工期在电缆施工区一侧及拉管施工场地四周设置土质排水沟，共计开挖 134m，排水沟断面尺寸为上口宽 0.6m，下口宽 0.2m，深 0.2m，边坡比 1:1，开挖土方量约 11m<sup>3</sup>；

并在排水沟末端设置土质沉沙池，顶长×顶宽×深为 3m×2.5m×1m，放坡开挖，边坡比 1:1，单个沉沙池容积为 3m<sup>3</sup>，共计 2 座，开挖土方 6m<sup>3</sup>。

综上所述，电缆施工区挖方量 692m<sup>3</sup>（表土剥离 319m<sup>3</sup>），填方量 692m<sup>3</sup>（表土回覆 319m<sup>3</sup>），无余方，无借方。

### （2）施工临时道路区

施工临时道路区临时占地扰动深度小于 20cm，根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018），“临时占地范围内扰动深度小于 20cm 的表土可不剥离，宜采取铺垫等保护措施”。故施工临时道路区可不进行表土剥离，采取铺垫措施。

### （3）工程土石方汇总

本工程土石方开挖总量为 692m<sup>3</sup>（表土剥离 319m<sup>3</sup>），填方量 692m<sup>3</sup>（表土回覆 319m<sup>3</sup>），无余方，无借方。

表 1.1-6 土石方挖填平衡情况表

单位：m<sup>3</sup>

分区	挖方量		填方量		借方	余方
	表土	基础	表土	基础		
电缆施工区	319	373	319	373	0	0
施工临时道路区	0	0	0	0	0	0
小计	319	373	319	373	0	0
合计	692		692		0	0

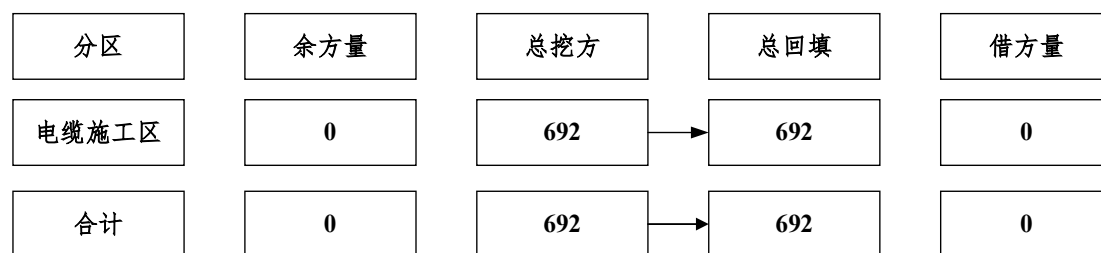
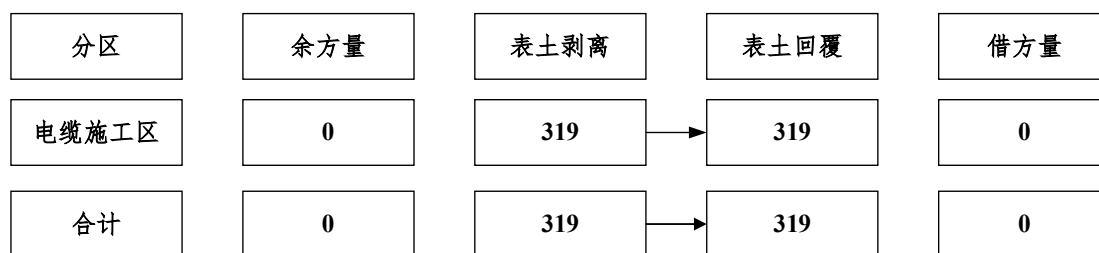


图 1.1-4 土石方平衡流向框图 单位：m<sup>3</sup>

表 1.1-7 表土平衡一览表

单位：m<sup>3</sup>

分区	表土剥离	表土回覆	调入	调出	借方	综合利用
电缆施工区	319	319	0	0	0	0
合计	319	319	0	0	0	0

图 1.1-5 表土平衡流向框图 单位: m<sup>3</sup>

### 1.1.6 项目施工进度情况

本项目主体工程施工进度情况见表 1.1-8。

表 1.1-8 项目主体工程施工进度表

工程名称		施工期		
		2026 年		
		7 月	8 月	9 月
电缆 施工	基础施工	—————		
	电缆敷设		—————	
	场地整理			—————

## 1.2 项目区概况

### 1.2.1 地形地貌

本线路沿线所属地貌区属于宁镇扬丘陵岗地~平原区,场地地貌类型为沉积平原,沿线地形较为平坦,线路路径沿线地面标高为 5.10~5.65m(1985 国家高程基准),沿线以其他土地为主,交通条件便利。

### 1.2.2 地质地震

按 DGJ32/TJ 208-2016《岩土工程勘察规范》规范,根据地基岩土体岩性、结构、成因类型、埋藏分布特征及其物理力学性质指标的异同性,将勘察深度范围内岩土体划分为 4 个工程地质层,分别为①素填土、②粉质粘土、③淤泥质粉质粘土、④粉质粘土。

根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)附录 A“我国主要城镇抗震设防烈度、基本设计地震加速度和设计地震分组”规定,沿线地区抗震设防烈度均为 7 度,设计基本地震加速度均为 0.10g,设计地震分组为第一组。根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2015),设计特征周期值 0.35s。

### 1.2.3 水系情况

镇江市是水资源较为丰富的城市,长江和大运河在这里交汇,秦淮河、太湖湖西、沿江三个水系在这里集聚。水资源主要有地表水、过境水、地下水、回归

水等四种形式。长江流经境内长 103.7km。京杭大运河境内全长 42.74km，在京口区谏壁镇与长江交汇。全市有流域面积 50km<sup>2</sup> 及以上河流 32 条（其中跨省 2 条），流域面积 50km<sup>2</sup> 以下至乡镇级主要河流 328 条。常年水面面积 1km<sup>2</sup> 及以上湖泊 2 个，0.5km<sup>2</sup>~1km<sup>2</sup> 湖泊 2 个，均为淡水湖泊。有水库 141 座，塘坝 3.97 万处；地下水取水井 13.49 万眼，取水量 1321.25 万 m<sup>3</sup>。根据地形分布情况，以宁镇山脉与茅山山脉为自然分水岭，河流可分为长江沿江水系、秦淮河水系和太湖湖西水系三部分，而秦淮河水系和太湖之水最终通向长江，实际上也是长江水系的组成部分。本次线路区域属长江流域水系，沿线河流为长江、捆山河。

依据《镇江市城市防洪规划》（2014-2030）的防洪规划分区，本工程位于捆山河以西片区。捆山河以西片区位于镇江新区捆山河以西。防洪风险来源主要为长江洪水、南部、西部山洪。除长江堤防外，主要防洪工程体系为行洪河道及其建筑物。河道主要有太平河、海溪河、捆山河、大港河等。捆山河位于本区域东部，总长 17.43km，集水面积 29.3km<sup>2</sup>，是排泄固山南部山丘洪水的主要排水河道。2013 年按 20 年一遇对捆山河进行整治，北部龟山闸拆除重建，南段华山闸南移临近太平河，沿线泵站、桥梁、涵洞改建。目前，捆山河达到 20 年一遇洪水标准。依据《镇江市城市防洪规划》（2014-2030），为降低长江洪水危害，优先实施长江堤防能力提升工程，全面建成百年一遇防洪屏障，本工程不受长江 100 年一遇洪水影响。

#### 1.2.4 气候特征

镇江市位于中纬度北亚热带，气候属北亚热带季风气候，由于季风环流的影响，具四季分明、气候湿润、光照充足、雨量充沛、无霜期长的特点。夏季受温暖潮湿的海洋气团控制，天气炎热多雨；冬季受极地大陆气团控制，以寒冷、少雨天气为主。根据镇江市气象站（1955-2022 年）气象资料统计数据，项目区多年气象要素特征值见表 1.2-1。

表 1.2-1 项目区域气象特征值一览表

项目	内容	单位	镇江市
气温	历年年平均气温	°C	15.5
	极端最高气温	°C	40.9 (1959.8.22)
	极端最低气温	°C	-12.0 (1955.1.16)
	最热月平均气温 (7 月)	°C	34.3
	最冷月平均气温 (1 月)	°C	-3.4

降水	平均降水量	多年	mm	1071.6
	最大年降水量	多年	mm	1919.1 (1991)
	最小年降水量	多年	mm	457.6 (1978)
	24 小时最大降雨量	多年	mm	215.3 (2003.7.5)
风速 风向	历年年均风速		m/s	3.1
	常年主导风向		/	ENE
	常年主导次风向		/	ESE
气压	年平均气压		Pa	101400
冻土深	最大冻土深		cm	9
积雪深度	最大积雪深度		cm	28

### 1.2.5 土壤和植被

镇江市土壤有五大类,分别为水稻土、黄棕壤土、潮土、石灰土和紫色岩土。各类土壤总面积 2500.8km<sup>2</sup>,其中水稻土有 1632km<sup>2</sup>,占 65.2%;潮土有 71.53km<sup>2</sup>,占 2.86%;黄棕土有 742.7km<sup>2</sup>,占 29.7%;其余为石灰土和紫色岩土。全市土地资源中低山丘陵以黄棕壤为主,岗地以黄土为主,平原以潜育型水稻土为主。本工程区主要土壤类型为水稻土。

表 1.2-2 表土调查情况表

防治分区	可剥离表土面积 (m <sup>2</sup> )	实际剥离表土面积 (m <sup>2</sup> )	剥离表土厚度 (m)
电缆施工区	1710	1063	0.30
施工临时道路区	480	/	/

镇江市植被类型为北亚热带常绿落叶阔叶混交林。自然植被分为针叶林、落叶阔叶林、落叶与常绿阔叶混交林、竹林、灌丛、草丛和水生植被等 7 个类型。针叶林有马尾松林、黑松林、湿地松、杉木林、侧柏林、水杉林和池山林等,落叶阔叶林有麻栎、黄檀林、枫香林、刺槐林和朴树等,常绿阔叶树有枹树、青冈栎林、黄檀和石栎林等。根据《关于上报镇江市 2020 年度森林覆盖率和林木覆盖率监测结果的报告》(镇林发〔2020〕73 号),镇江市林草覆盖率约为 25.41%。本项目区植被主要为狗尾草,项目区林草覆盖率为 50%。

### 1.3 水土保持分析与评价

根据《中华人民共和国水土保持法》、《生产建设项目水土保持技术标准》(GB50433-2018)对工程水土保持制约性因素进行分析和评价。工程所在区不涉及河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护带;不涉及全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站;不属于水土流失严重、生态脆弱的地区;不属于崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区;

不涉及饮用水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地，风景名胜区、地质公园、森林公园、重要湿地和生态脆弱区等。依据《省水利厅关于发布<江苏省省级水土流失重点预防区和重点治理区>的公告》（苏水农〔2014〕48号），工程所在地江苏省镇江市京口区姚桥镇属于江苏省省级水土流失重点预防区。

由于项目选线无法避让江苏省省级水土流失重点预防区。因此，本工程在主体施工上优化施工工艺，严格控制占地面积；加强表土资源保护；设置泥浆沉淀池措施，避免泥浆外排；设置苫盖、排水、沉沙等措施来减少水土流失，符合节约用地和减少扰动的要求。因此，从水土保持的角度分析，本工程无重大水土保持制约因素。

#### 1.4 水土流失防治目标及防治责任范围

##### 1.4.1 设计水平年

主体工程计划 2026 年 7 月开工，2026 年 9 月完工，根据主体工程施工时间和水土保持措施实施进度安排，确认本方案设计水平年为主体工程完工后的当年，即 2026 年。

##### 1.4.2 防治目标

本项目区所在地位于江苏省镇江市京口区姚桥镇境内，根据《江苏省水土保持规划（2015-2030）》，项目区属于南方红壤区——江淮丘陵及下游平原区——沿江丘陵岗地农田防护人居环境维护区——镇江沿江平原土壤保持水质维护区。依据《省水利厅关于发布<江苏省省级水土流失重点预防区和重点治理区>的公告》（苏水农〔2014〕48号），工程所在地江苏省镇江市京口区姚桥镇属于江苏省省级水土流失重点预防区。根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018），本项目水土流失防治标准应执行南方红壤区一级标准。

根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018）4.0.7 节规定土壤流失控制比在轻度侵蚀为主的区域不应小于 1；根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）3.2.2 节第 4 条规定对无法避让的水土流失重点预防区和重点治理区的生产建设项目，林草覆盖率应提高 1 个~2 个百分点。

因此本工程水土流失防治标准如下：施工期渣土防护率应达 95%，表土保护率应达 92%；至设计水平年，自然恢复期水土流失治理度应达 98%，土壤流失控制比应达 1.0，渣土防护率应达 97%，表土保护率应达 92%，林草植被恢复率

98%，林草覆盖率 27%。防治目标具体情况见表 1.4-1:

表 1.4-1 防治标准指标计算表

指标	标准值		侵蚀强度调整	地理位置调整	方案目标值	
	施工期	设计水平年	微度	重点治理区	施工期	设计水平年
水土流失治理度 (%)	/	98	/	/	/	98
土壤流失控制比	/	0.9	+0.1	/	/	1.0
渣土防护率 (%)	95	97	/	/	95	97
表土保护率 (%)	92	92	/	/	92	92
林草植被恢复率 (%)	/	98	/	/	/	98
林草覆盖率 (%)	/	25	/	+2	/	27

### 1.4.3 防治责任范围

按照“谁建设、谁保护，谁造成水土流失、谁负责治理”的原则和《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018），结合本工程占地概况、水土流失影响分析，对工程建设及生产可能造成水土流失范围进行界定，以确定水土流失防治责任范围。确定本工程水土流失防治责任范围为 2255m<sup>2</sup>，其中永久占地为 107m<sup>2</sup>，临时占地为 2148m<sup>2</sup>。

表 1.4-2 水土流失防治责任范围表

单位：m<sup>2</sup>

防治分区	占地性质		总占地面积
	永久占地面积	临时占地面积	
电缆施工区	107	1668	1775
施工临时道路区	0	480	480
<b>防治责任范围</b>	<b>107</b>	<b>2148</b>	<b>2255</b>

## 2 水土流失预测与水土保持措施布设

### 2.1 水土流失预测

#### 2.1.1 预测单元

本工程水土流失预测范围为 2255m<sup>2</sup>。预测单元为工程建设扰动地表的时段和形式总体相同、扰动强度和特点大体一致的区域。本工程的预测单元为电缆施工区和施工临时道路区。

#### 2.1.2 预测时段

本工程为新建输变电工程，根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018），水土流失预测时段包括施工期和自然恢复期。各区域水土流失预测时段根据工程施工进度安排确定，并按照最不利情况考虑。施工期预测时间应按连续 12 个月为一年计；不足 12 个月，但达到一个雨（风）季长度的，按一年计；不足一个雨（风）季长度的，按占雨（风）季长度的比例计算。镇江市雨季主要是 5~9 月份。

本工程施工期为 2026 年 07 月~2026 年 09 月，自然恢复期取完工后 2 年。根据项目本身建设进度，水土流失预测时段情况详见表 2.1-1。

表 2.1-1 项目水土流失预测分区及时段表

阶段	预测单元	施工时段	预测时段 (a)	主要内容
施工期	电缆施工区	2026.07-2026.09	0.60	电缆基础开挖、电缆敷设
	施工临时道路区	2026.07-2026.09	0.60	车辆占压
自然恢复期	电缆施工区	2026.10-2028.09	2.00	无
	施工临时道路区	2026.10-2028.09	2.00	无

#### 2.1.3 土壤侵蚀模数

根据现场勘查项目地形主要为平原，参照项目区同类项目监测数据，最终确定了项目所在地土壤侵蚀强度为微度，确定土壤侵蚀模数背景值为 160t/(km<sup>2</sup>·a)。

本工程施工期各区域侵蚀模数采取类比分析法，通过类比“江苏镇江丁卯 220 千伏变电站 35 千伏送出线路工程”获得。江苏辐环环境科技有限公司于 2022 年 3 月至 2024 年 6 月对江苏镇江丁卯 220 千伏变电站 35 千伏送出线路工程开展了水土保持监测工作，并完成了《江苏镇江丁卯 220 千伏变电站 35 千伏送出线路工程水土保持监测总结报告》。江苏通凯生态科技有限公司自 2024 年 6 月开展了水土保持设施验收报告编制工作，提交了《江苏镇江丁卯 220 千伏变电站

35 千伏送出线路工程水土保持设施验收报告》，于 2024 年 8 月由建设单位国网江苏省电力有限公司镇江供电分公司组织开展本项目水土保持设施自主验收，于 2024 年 8 月依法公示，并于 2024 年 9 月取得验收备案回执。参考性分析对照详见表 2.1-2。

表 2.1-2 参考性分析对照表

项目	江苏镇江华润镇江经开区三桥渔光互补光伏发电项目 110 千伏送出工程	江苏镇江丁卯 220 千伏变电站 35 千伏送出线路工程	类比结果
地理位置	江苏省镇江市京口区	江苏省镇江市京口区	相同
气候条件	北亚热带湿润季风气候	北亚热带湿润季风气候	相同
年平均降水量	1071.6mm	1071.6mm	相同
地形地貌	平原	平原	相同
土壤类型	水稻土	水稻土	相同
水土流失强度	微度水蚀	微度水蚀	相同

表 2.1-3 类比项目实际监测侵蚀模数统计表

预测时段	江苏镇江丁卯 220 千伏变电站 35 千伏送出线路工程（类比）	
	防治分区	实际监测侵蚀模数[t/(km <sup>2</sup> ·a)]
施工期	塔基区	1070
	电缆施工区	1150
	牵张场区	750
	跨越场地施工区	750
	施工临时道路区	800
	拆除线路区	860

本工程与类比工程均为输变电工程，年平均降水量、水土流失强度、气候条件、土壤类型、地形地貌等相同，因此本工程与类比工程有一定的可比性。根据各区的施工特点对类比工程的侵蚀模数进行修正后可应用于本工程。

针对本工程的环境条件、施工条件和防护措施条件等实际情况，对扰动地表后侵蚀模数的取值，在下列三个方面进行修正。

1) 环境条件：本工程多年平均降水量为 1071.6mm，类比工程的多年平均降水量为 1071.6mm，降雨量相近相同，因此，设置修正系数为 1.0。

2) 扰动强度：本工程土石方工程量和扰动地表的强度与类比工程相近，因此，根据不同分区，设修正系数 1.0。

3) 防护措施条件：类比工程所列监测结果是在工程施工过程中采取了一定

的水土保持措施的基础上进行监测的，若施工过程中不采取任何措施，则工程扰动后的土壤侵蚀模数将会比监测结果大。而水土流失量预测的基础是按生产建设项目正常的设计功能，在无水土保持工程条件下可能产生的土壤流失量。因此，设置修正系数为 1.5。

自然恢复期：项目建成，植被种植完成后，开始发挥保水保土的作用，电缆施工区除硬化部分，自然恢复期水土流失治理达标，土壤侵蚀模数达到背景值，各预测单元的侵蚀模数见表 2.1-4。

表 2.1-4 扰动后土壤侵蚀模数类比表

预测时段	江苏镇江丁卯 220 千伏变电站 35 千伏送出线路工程（类比）		调整系数			江苏镇江华润镇江经开区三桥渔 光互补光伏发电项目 110 千伏送 出工程（本工程）	
	预测单元	监测土壤侵蚀 模数[t/(km <sup>2</sup> ·a)]	环境 条件	扰动 强度	防护措 施条件	预测单元	预测土壤侵蚀模 数[t/(km <sup>2</sup> ·a)]
施工 期	电缆施工区	1150	1	1	1.5	电缆施工区	1725
	施工临时道路区	800	1	1	1.5	施工临时道路区	1200

#### 2.1.4 预测结果

根据上述确定的土壤侵蚀模数，按公式法进行各分区水土流失量估算。结合项目预测单元及预测时段划分，预测项目建设时如不采取水土保持措施可能产生土壤流失量，结果见表 2.1-5。

根据分时段计算结果可知，如不采取水保措施，项目在整个建设期可能产生土壤流失总量为 3.06t，新增土壤流失量为 2.14t。

表 2.1-5 项目水土流失量预测计算成果表

预测时段	预测单元	面积 (m <sup>2</sup> )	预测 时段 (a)	侵蚀模数 背景值 [t/(km <sup>2</sup> ·a)]	背景 流失 量(t)	扰动后侵 蚀模数 [t/(km <sup>2</sup> ·a)]	流失 总量 (t)	新增 流失 量(t)	新增占 比(%)
施工期	电缆施工区	1775	0.6	160	0.17	1725	1.84	1.67	92.06
	施工临时道路区	480	0.6	160	0.05	1200	0.35	0.3	
小计	/	2255	/	/	0.22	/	2.19	1.97	
自然恢复期 第一年	电缆施工区	1668	1	160	0.27	240	0.4	0.13	7.94
	施工临时道路区	480	1	160	0.08	240	0.12	0.04	
小计	/	2148	/	/	0.35	/	0.52	0.17	
自然恢复期 第二年	电缆施工区	1668	1	160	0.27	160	0.27	0	
	施工临时道路区	480	1	160	0.08	160	0.08	0	
小计	/	2148	/	/	0.35	/	0.35	0	
合计					<b>0.92</b>	/	<b>3.06</b>	<b>2.14</b>	<b>100</b>

注：自然恢复期电缆施工区水土流失面积已扣除硬化占地面积。

### 2.1.5 水土流失危害分析

水土流失危害往往具有潜在性，若形成水土流失危害后才实施治理，不但造成了土地资源破坏和土地生产力的下降、淤积水系等问题，而且治理难度大、费用高，因此必须根据有关经验，综合分析水土流失预测结果，对项目可能造成水土流失危害进行预测，根据预测结果采取有针对性的防治措施。

工程施工过程中可能造成水土流失危害，主要包括以下几个方面：

(1) 破坏原地貌、加速土壤侵蚀。项目施工过程中扰动原地貌，损坏原有水土保持设施，原地貌破坏后涵养水源、保持水土功能丧失，地表裸露，土壤抗侵蚀能力急剧下降，单位面积的土壤侵蚀量直线上升，土壤侵蚀加速。

(2) 项目在基础开挖、机械占压等施工过程中，如遇较强的降雨，若没有防护措施，在降雨及人为因素作用下将会产生大量泥沙，造成较为严重的水土流失，对项目本身的施工安全也会造成一定的威胁。

(3) 工程施工中需开挖、堆置、回填土方，土方装卸堆存过程中易产生粉尘，在风力作用下，也易引起风蚀，并产生大气粉尘污染，对局部生态环境造成不良影响。

## 2.2 水土保持措施布设

### 2.2.1 水土保持措施总体布局

防治措施的总体布局，以防治新增水土流失和改善区域生态环境为主要目的，结合主体工程已有的具有水土保持功能的工程项目，补充布设水土保持措施，开发与防治相结合，工程、植物、临时措施相配合，形成完整的防治体系，同时突出重点防治工程措施和临时防治工程措施。各区水土流失防治措施设置情况详见表 2.2-1。

表 2.2-1 防治措施总体布局表

分区	措施类型	主体工程已有措施	本方案补充设计措施
电缆施工区	工程措施	表土剥离、土地整治	/
	植物措施	撒播草籽	/
	临时措施	泥浆沉淀池	防尘网苫盖、土质排水沟、土质沉沙池
施工临时道路区	工程措施	/	土地整治
	植物措施	/	撒播草籽
	临时措施	铺设钢板	/

## 2.2.2 分区措施布设

### (1) 电缆施工区

#### ① 工程措施

表土剥离:本工程主体设计中已考虑在施工前期对电缆施工区开挖区域进行表土剥离,剥离面积  $1063\text{m}^2$ ,剥离厚度  $0.3\text{m}$ ,表土剥离量为  $319\text{m}^3$ 。

土地整治:本工程主体设计中已考虑在施工后期对电缆施工区除硬化以外区域进行土地整治,主要包括场地清理、平整、表土回覆,整治面积约  $1668\text{m}^2$ ,表土回覆量为  $319\text{m}^3$ ,整治后的土地全部进行植被恢复。

#### ② 植物措施

撒播草籽:本工程主体设计已考虑施工后期对电缆施工区占用的空闲地区域采取撒播草籽措施,撒播密度为  $150\text{kg}/\text{hm}^2$ ,撒播面积约  $1668\text{m}^2$ ,撒播草籽总量为  $25.02\text{kg}$ 。

#### ③ 临时措施

泥浆沉淀池:为减少拉管施工期间产生的水土流失,拟在拉管施工一侧设置泥浆沉淀池,对钻渣泥浆进行沉淀和固化处理,禁止将钻渣泥浆排入周围水塘。本工程主体设计中已考虑在施工过程中在拉管一侧设置一座泥浆沉淀池,本工程共设置 1 座泥浆沉淀池。泥浆沉淀池采用半挖半填形式,尺寸大小根据实际场地及开挖泥浆量情况设计,泥浆沉淀池容量为  $90\text{m}^3$ 。

防尘网苫盖:本方案补充在施工过程中对电缆施工区临时堆土及裸露地表进行防尘网苫盖,苫盖面积约  $1200\text{m}^2$ 。

土质排水沟:本方案补充在施工过程中于电缆施工区一侧及拉管施工区域设置土质排水沟,共计开挖排水沟  $134\text{m}$ ,排水沟断面尺寸为上口宽  $0.6\text{m}$ ,下口宽  $0.2\text{m}$ ,深  $0.2\text{m}$ ,边坡比  $1:1$ ,开挖土方量约  $11\text{m}^3$ 。

土质沉沙池:本方案补充在施工过程中于排水沟末端设置土质沉沙池,顶长 $\times$ 顶宽 $\times$ 深为  $3\text{m}\times 2.5\text{m}\times 1\text{m}$ ,放坡开挖,边坡比  $1:1$ ,单个沉沙池容积为  $3\text{m}^3$ ,共计 2 座,开挖土方  $6\text{m}^3$ 。

### (2) 施工临时道路区

#### ① 工程措施

土地整治:本方案补充在施工后期对施工临时道路区进行土地整治,整治面积约  $480\text{m}^2$ ,整治后的土地全部进行植被恢复。

## ②植物措施

撒播草籽:本工程主体设计已考虑施工后期对施工临时道路区全区采取撒播草籽措施,撒播密度为  $150\text{kg}/\text{hm}^2$ ,撒播面积约  $480\text{m}^2$ ,撒播草籽总量为  $7.20\text{kg}$ 。

## ③临时措施

铺设钢板:为减少对地表的扰动,本工程主体设计中已考虑在施工期间对松软路面区域铺设一定数量的钢板,施工结束后土地整治即可恢复地表植被,沿线施工临时道路区共需铺设钢板  $400\text{m}^2$ 。

## 2.2.3 水土保持措施工程量汇总

本工程水土保持措施工程量详见表 2.2-2。

表 2.2-2 本工程水土保持措施工程量汇总表

防治分区	措施类型		内容类别	单位	数量	布设位置	结构形式	实施时间	
电缆施工区	工程措施	主体 已有	表土剥离	$\text{m}^3$	319	电缆施工区开挖区域	剥离厚度 0.3m, 剥离面积 $1062\text{m}^2$	2026.07- 2026.08	
			土地整治	$\text{m}^2$	1668	除硬化以外区域	场地清理、平整、覆土	2026.09	
	植物措施	主体 已有	撒播草籽	$\text{m}^2$	1668	占用空闲地区域	狗牙根草籽 $150\text{kg}/\text{hm}^2$	2026.09	
	临时措施	方案 新增	泥浆沉淀池	座	1	拉管施工区域一侧	半挖半填, 容量为 $32\text{m}^3$	2026.07- 2026.08	
			防尘网苫盖	$\text{m}^2$	1200	临时堆土及裸露地表	聚乙烯圆丝 6 针防尘网, 长×宽: $8\text{m} \times 40\text{m}$	2026.07- 2026.08	
			土质排水沟	长度	$\text{m}$	134	电缆施工区一侧及拉管施工区域	上顶宽 0.6m, 下底宽 0.2m, 深 0.2m, 边坡比 1:1	2026.07- 2026.08
				土方量	$\text{m}^3$	11			
土质沉沙池	座	2	排水沟末端	顶长×顶宽×深为 $3\text{m} \times 2.5\text{m} \times 1\text{m}$ , 放坡开挖, 边坡比 1:1	2026.07- 2026.08				
施工临时道路区	工程措施	方案 新增	土地整治	$\text{m}^2$	480	全区	场地清理、平整	2026.09	
	植物措施	方案 新增	撒播草籽	$\text{m}^2$	480	全区	狗牙根草籽 $150\text{kg}/\text{hm}^2$	2026.09	
	临时措施	主体 已有	铺设钢板	$\text{m}^2$	400	松软路面区域	6mm 厚钢板	2026.07- 2026.08	

## 2.2.4 防治措施进度安排

参照主体工程施工进度,各项水土保持措施的实施进度与相应的工程进度衔接。各防治区内的水土保持措施配合主体工程同时实施,相互协调,有序进行。坚持“因地制宜,因害设防”的原则,首先安排水土流失严重区域的防治措施,在

措施安排上，工程措施、植物措施、临时措施应根据轻重缓急、统筹考虑，施工管理措施贯穿整个施工期间。原则上应对工程措施优先安排，植物措施可略为滞后，但须根据植物的生物学特性，合理安排季节实施，并在总工期内完成所有水土保持措施。

表 2.2-3 主体工程与水土保持工程实施进度表

防治分区	工程名称		施工期		
			2026年		
			7月	8月	9月
电缆施工区	主体工程		—————		
	工程措施	表土剥离	—————	—————	
		土地整治			—————
	植物措施	撒播草籽			—————
	临时措施	泥浆沉淀池	—————	—————	
		防尘网苫盖	—————	—————	
		土质排水沟	—————	—————	
土质沉沙池		—————	—————		
施工临时道路区	工程措施	土地整治			—————
	植物措施	撒播草籽			—————
	临时措施	铺设钢板	—————	—————	

注：“—————”为主体工程进度；“—————”为水土保持措施进度。

### 3 水土保持投资估算及效益分析

#### 3.1 投资估算成果

本项目水土保持工程总投资 14.39 万元，其中工程措施投资 1.08 万元；植物措施投资 0.35 万元；临时措施投资 4.37 万元；独立费用 7.04 万元（其中建设管理费 3.17 万元，工程监理费 0.13 万元，科研勘测设计费 3.74 万元），基本预备费 1.28 万元，水土保持补偿费 2706 元。

表 3.1-1 本工程水土保持投资估算总表 单位：万元

序号	工程或费用名称	主体已有	方案新增	合计
1	第一部分工程措施	1.06	0.02	1.08
2	第二部分植物措施	0.27	0.08	0.35
3	第三部分施工临时工程措施	3.4	0.97	4.37
4	第四部分独立费用	3.27	3.77	7.04
	一至四部分合计	8	4.84	12.84
5	基本预备费 10%	0.8	0.48	1.28
6	水土保持补偿费	0.27	0	0.27
7	水土保持总投资	9.07	5.32	14.39

表 3.1-2 水土保持工程措施投资估算表 单位：万元

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合计（万元）
一	电缆施工区	/	/	/	1.06
(一)	表土保护工程				0.98
1	表土剥离				0.09
	表土剥离*	m <sup>2</sup>	1063	0.82	0.09
2	表土回覆				0.89
	表土回覆*	m <sup>3</sup>	319	27.84	0.89
(二)	土地整治工程				0.08
1	土地整治				0.08
	全面整地*	m <sup>2</sup>	1668	0.5	0.08
二	施工临时道路区	/	/	/	0.02
(一)	土地整治工程				0.02
1	土地整治				0.02
	全面整地	m <sup>2</sup>	480	0.5	0.02
合计	/	/	/	/	1.08

注：带“\*”为主体已有水土保持措施。

表 3.1-3 水土保持植物措施投资估算表 单位：万元

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合计（万元）
一	电缆施工区	/	/	/	0.27
(一)	植被恢复与建设工程				0.27

1	撒播草籽*				0.27
	直播种草/不覆土	m <sup>2</sup>	1668	1.59	0.27
二	施工临时道路区	/	/	/	0.08
(一)	植被恢复与建设工程				0.08
1	撒播草籽*				0.08
	直播种草/不覆土	m <sup>2</sup>	480	1.59	0.08
合计	/	/	/	/	0.35

注：带“\*”为主体已有水土保持措施。

表 3.1-4 水土保持临时措施投资估算表 单位：万元

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(万元)
一	临时防护工程				4.2
(一)	电缆施工区	/	/	/	1
1	泥浆沉淀池*	座	1	1960	0.2
2	临时覆盖				0.75
	防尘网苫盖	m <sup>2</sup>	1200	6.29	0.75
3	土质排水沟				0.03
	土方开挖	m <sup>3</sup>	11	28.1	0.03
4	土质沉沙池				0.02
	土方开挖	m <sup>3</sup>	6	26.12	0.02
(二)	施工临时道路区	/	/	/	3.2
1	临时覆盖				3.2
	铺设钢板*	m <sup>2</sup>	400	80	3.2
二	其他临时工程	%	2	14300	0.03
三	施工安全生产专项	%	2.5	56300	0.14
合计	/	/	/	/	4.37

注：带“\*”为主体已有水土保持措施。

表 3.1-5 本工程水土保持其他费用估算详表

编号	工程或费用名称	计算依据	合计
一	建设管理费	/	3.17
1	项目经常费	(第一~第三部分)×2.5%	0.15
2	水土专项验收	/	3
3	技术咨询费	(第一~第三部分)×0.4%	0.02
二	工程建设监理费	/	0.13
三	科研勘测设计费	/	3.74
1	工程科学研究试验费	/	/
2	工程勘测设计费	/	3.74
	水土保持方案编制费	/	3.74
合计			3.74
防治责任范围(m <sup>2</sup> )		单价(元/m <sup>2</sup> )	水土保持补偿费(元)
2255		1.2	2706

### 3.2 效益分析

### 3.2.1 水土流失治理度

至设计水平年，项目建设可能造成水土流失面积 2255m<sup>2</sup>，水土流失治理达标面积 2224m<sup>2</sup>，水土流失治理度可达 98.6%。具体计算见表 3.2-1。

表 3.2-1 水土流失治理度计算表

防治分区	扰动土地面积 (m <sup>2</sup> )	水土流失面积 (m <sup>2</sup> )	水土流失治理达标面积 (m <sup>2</sup> )				水土流失治理度 (%)	防治标准 (%)	是否达标
			场地道路硬化面积	工程措施	植物措施	小计			
电缆施工区	1775	1775	107	0	1642	1749	98.6	98	达标
施工临时道路区	480	480	0	0	475	475			
合计	2255	2255	107	0	2117	2224			

注：水土流失治理达标面积中，工程措施与植物措施重合部分不再重复计列。

### 3.2.2 土壤流失控制比

通过采用一系列的水土保持措施，自然恢复期项目区内治理后每平方公里年平均土壤流失量将小于本工程容许土壤流失量；项目水土流失防治责任范围内容许土壤流失量为 500t/(km<sup>2</sup>·a)，至设计水平年，各项水保措施发挥作用后，治理后每平方公里年平均土壤流失量达到 160t/(km<sup>2</sup>·a)，土壤流失控制比为 3.1。

### 3.2.3 渣土防护率

本项目拦挡永久弃渣及临时堆土量约 692m<sup>3</sup>，实际挡护的永久弃渣及临时堆土量约 680m<sup>3</sup>，渣土防护率达到 98.3%。

### 3.2.4 表土保护率

本项目可剥离表土总量为 657m<sup>3</sup>，在采取保护措施后保护表土数量为 618m<sup>3</sup>，其中剥离保护的表土 319m<sup>3</sup>，通过苫盖和铺垫保护的表土量为 299m<sup>3</sup>，表土保护率为 94.1%。

### 3.2.5 林草植被恢复率

本工程可恢复林草植被面积 2148m<sup>2</sup>，林草类植被面积 2117m<sup>2</sup>，林草植被恢复率可达到 98.6%。

表 3.2-2 林草植被恢复率计算表

防治分区	可恢复植被面积 (m <sup>2</sup> )	林草植被面积 (m <sup>2</sup> )	林草植被恢复率 (%)	防治标准 (%)	是否达标
电缆施工区	1668	1642	98.6	98	是
施工临时道路区	480	475			
合计	2148	2117			

### 3.2.6 林草覆盖率

本工程建设区总面积 2255m<sup>2</sup>，林草类植被面积 2117m<sup>2</sup>，林草覆盖率可达 93.9%。

表 3.2-3 林草覆盖率统计表

防治分区	防治责任范围 (m <sup>2</sup> )	林草类植被面积 (m <sup>2</sup> )	林草覆盖率 (%)	防治标准 (%)	是否达标
电缆施工区	1775	1642	93.9	27	是
施工道路区	480	475			
合计	2255	2117			

### 3.2.7 六项指标达标情况

通过计算分析，至设计水平年水土流失防治目标的实现情况为：水土流失治理度 98.6%、土壤流失控制比 3.1、渣土防护率 98.3%、表土保护率 94.1%、林草植被恢复率 98.6%、林草覆盖率 93.9%。

表 3.2-4 防治效果汇总表

评估指标	计算方法	计算依据	单位	数量	计算结果	防治目标	达标情况
水土流失治理度 (%)	项目水土流失防治责任范围内水土流失治理达标面积占水土流失总面积的百分比	水土流失治理达标面积	m <sup>2</sup>	2224	98.6	98	达标
		水土流失总面积	m <sup>2</sup>	2255			
土壤流失控制比	项目水土流失防治责任范围内容许土壤流失量与治理后每平方公里年平均土壤流失量之比	容许土壤流失量	t/(km <sup>2</sup> ·a)	500	3.1	1.0	达标
		治理后每平方公里年平均土壤流失量	t/(km <sup>2</sup> ·a)	160			
渣土防护率 (%)	项目水土流失防治责任范围内采取措施实际挡护的永久弃渣、临时堆土数量占永久弃渣和临时堆土总量的百分比	临时堆土量	m <sup>3</sup>	680	98.3	97	达标
		临时堆土总量	m <sup>3</sup>	692			
表土保护率 (%)	项目水土流失防治责任范围内保护的表土数量占可剥离表土总量的百分比	保护的表土数量	m <sup>3</sup>	618	94.1	92	达标
		可剥离表土总量	m <sup>3</sup>	657			
林草植被恢复率 (%)	项目水土流失防治责任范围内林草类植被面积占可恢复林草植被面积的百分比	林草类植被面积	m <sup>2</sup>	2117	98.6	98	达标
		可恢复林草植被面积	m <sup>2</sup>	2148			
林草覆盖率 (%)	项目水土流失防治责任范围内林草类植被面积占总面积的百分比	林草类植被面积	m <sup>2</sup>	2117	93.9	27	达标
		项目建设区面积 (扣除恢复耕地)	m <sup>2</sup>	2255			

### 3.3 水土保持管理

为贯彻《中华人民共和国水土保持法》、《江苏省生产建设项目水土保持管理办法》（苏水规〔2021〕8号）、《水利部办公厅关于做好生产建设项目水土保持承诺制管理的通知》（办水保〔2020〕160号）和《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第53号），确保本水土保持方案防治措施按“三同时”的要求顺利实施，充分发挥水土保持措施的作用，使项目建设过程中的水土流失控制在方案目标值以内，促进项目区及周边生态环境的良性发展，特提出以下保证措施。

#### 3.3.1 组织管理

根据国家有关法律法规，本工程水土保持方案为报告表项目，实施承诺制管理。建设单位承诺已经知晓并将认真履行水土保持各项法定义务；所填写的信息真实、完整、准确；所提交的水土保持方案符合相关法律法规、技术标准的要求；严格执行水土保持“三同时”制度，按照所提交的水土保持方案，落实各项水土保持措施，有效防治项目建设中的水土流失；项目投产使用前完成水土保持设施自主验收并报备；依法依规按时足额缴纳水土保持补偿费；积极配合水土保持监督检查；愿意承担作出不实承诺或者未履行承诺的法律责任和失信责任。水土保持方案在报批前，生产建设单位应当通过其网站、生产建设项目所在地公共媒体网站或者相关政府网站向社会公开拟报批的水土保持方案全文，且持续公开期限不得少于10个工作日。对于公众提出的问题和意见，生产建设单位应当逐一处理与回应，并在水土保持行政许可承诺书中予以说明。

报告表经江苏省水利厅批复后，建设单位将成立与环境保护相结合的水土保持方案实施管理机构，并设专人（专职或兼职）负责水土保持工作，协调好水土保持方案与主体工程的关系，负责组织实施审批的水土保持方案，全力保证水土保持工作按计划进行。水土保持方案实施管理机构主要工作职责如下：①认真贯彻执行“预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益”的水土保持工作方针，确保水土保持工程安全，充分发挥水土保持工程效益；②建立水土保持目标责任制，把水土保持列为工程进度、质量考核的内容之一，制定水土保持方案详细实施计划；③工程施工期间，与设计、施工单位保持畅通联系，协调好水土保持方案与主体工程的关系，确保水土保持设施的正常建设，最大限度减少人为造成的水土流失与生态环境的破坏；④深入

工程现场进行检查,掌握工程施工和运行期间的水土流失状况及其防治措施落实情况;⑤建立、健全各项档案,积累、分析整编资料,为水土保持工程验收提供相关资料。

### 3.3.2 后续设计

本项目处于可研阶段,水土保持应纳入初设和施工图设计中。水土保持方案经批准后,对照《江苏省生产建设项目水土保持管理办法》(苏水规〔2021〕8号),生产建设项目地点、规模发生重大变化,水土保持措施发生重大变更的,生产建设单位应当补充水土保持方案变更报告或修改水土保持方案,报原审批机关审批。

### 3.3.3 水土保持监测和监理

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》(水保〔2019〕160号)和《江苏省生产建设项目水土保持管理办法》(苏水规〔2021〕8号)中相关规定。对报告表项目水土保持监测工作未提出要求,因此,本工程建设单位可依据需要自行开展水土保持监测工作。凡主体工程开展监理工作的生产建设项目,应当按照国家建设监理、水土保持监理的有关规定和技术规范、批准的水土保持方案及工程设计文件、工程施工合同、监理合同等,开展水土保持监理工作,由于本工程征占地面积在50公顷以下且挖填土石方总量在50万立方米以下,因此不对水土保持监理单位的人员配备和资质提出要求。

### 3.3.4 水土保持施工

施工过程中应注重保护表土植被,严格控制和管理车辆机械的运行范围,必要时设立保护地表及植被的警示牌,防止扩大对地表的扰动。对临时排水设施应进行经常性检查维护,保证其排水通畅。对建成的水土保持设施应有明确的管理维护要求。工程措施施工时,应对施工质量实时检查,对不符合设计要求或质量要求的工程,责令其重建,直到满足要求为止。植物措施工程施工时,应注意加强植物措施的后期管护工作,确保各种植物的成活率,发挥植物措施的水土保持效益。

### 3.3.5 水土保持设施验收

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》(水保〔2017〕365号)、《江苏省生产建设项目水土保持管理办法》的通知(苏水规〔2021〕8号)和《生产建设项目水土保持方案管理办法》(水

利部令第 53 号)，生产建设项目的水土保持设施验收，由生产建设单位自主开展。水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设项目不得投产使用。存在下列情形之一的，水土保持设施验收结论应当为不合格：①未依法依规履行水土保持方案及重大变更编报审批程序的；②弃土弃渣未堆放在经批准的水土保持方案确定的专门存放地的；③水土保持措施体系、等级和标准或者水土流失防治指标未按照水土保持方案批复要求落实的；④存在水土流失风险隐患的；⑤水土保持设施验收材料明显不实、内容存在重大缺项、遗漏的；⑥水土保持分部工程和单位工程未经验收或验收不合格的；⑦未依法依规缴纳水土保持补偿费的；⑧存在法律法规和技术标准规定不得通过水土保持设施验收的其他情形的。

本项目为编制水土保持方案报告表项目，生产建设单位应当按照水土保持法律法规、标准规范、水土保持方案及其审批决定、水土保持后续设计等，组织验收工作，形成验收鉴定书，明确验收结论。验收合格意见应当经三分之二以上验收组成员同意并签字。实行承诺制或者备案制管理的项目，其水土保持设施验收组中应当有至少一名省级水行政主管部门水土保持方案专家库专家。

生产建设单位应当在水土保持设施验收合格后，通过其官方网站或者其他公众知悉的网站公示水土保持设施验收鉴定书，公示时间不得少于 20 个工作日。生产建设单位应当在向社会公开水土保持设施验收材料后、生产建设项目投产使用前，在水土保持设施验收通过 3 个月内向省水利厅报备验收材料。依法编制水土保持报告表和实行承诺制管理的生产建设项目，水土保持设施验收报备时只需提交水土保持设施验收报备申请、验收鉴定书和向社会公开的时间、地点及方式等材料。



生产建设项目水土保持设施验收合格后，生产建设单位或者运行管理单位应当依法防治生产运行过程中发生的水土流失，加强对水土保持设施的管理维护，确保水土保持设施长期发挥效益。

附

件

附

图

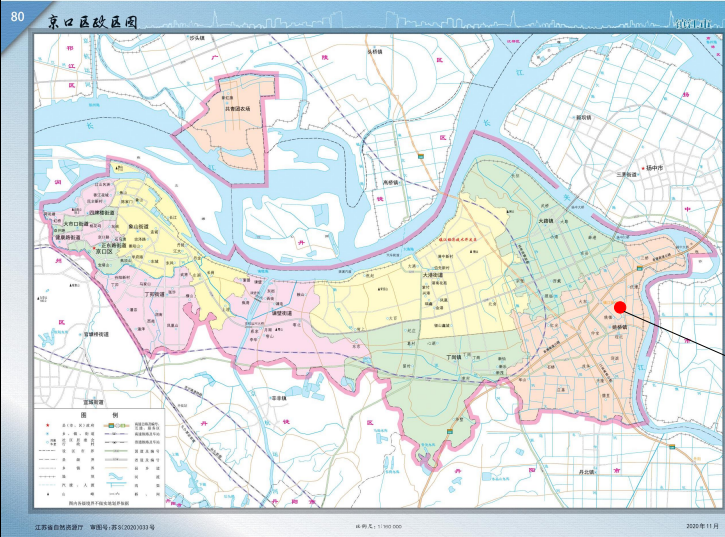

附图1 项目地理位置图
